



ACTA PARCIAL DE OBRA

1. DESCRIPCION GENERAL				
CLASE DE ACTA:	FINAL: _____ PARCIAL: <u>X</u> No.: <u>03</u>			
CONTRATO DE:	OBRA	Nº:	090	AÑO: 2024

CONTRATANTE:	E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DE GARZÓN			
CONTRATISTA O CONVINIENTE:	NOMBRE O RAZON SOCIAL:	CONSORCIO SAN VICENTE		
	NIT O CC:	901.785.549-8		
	DIRECCIÓN:	CR 4 2 85 ZN INDUSTRIAL KM 3 VIA PALERMO	TEL.	8716826
	CIUDAD:	PALERMO - HUILA		
	REPRESENTANTE LEGAL:	WILLIAM ALEXANDER POLO POLANIA		
	CC:	7.711.612 de Neiva-Huila		
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA			
REGISTRO PRESUPUESTAL:	SPGR No 224 RP No 557 - E.S.E HOSPITAL DPTAL SAN VICENTE			
CUENTA BANCARIA	Nº: 267877108 Tipo de Cuenta: CORRIENTE Banco: BANCO DE OCCIDENTE			
VALOR INICIAL (CONTRATISTA):	\$ 86.899.134.742			
	Valor en Letras: OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/Cte.			
VALOR ADICIONAL	Nº2	N.A.		
VALOR TOTAL	OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/Cte. (\$ 86.899.134.742) ✓			
PLAZO INICIAL:	TREINTA (30) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO.			
PLAZO ADICIONAL:	Nº1	N.A.		
PLAZO TOTAL:	TREINTA (30) MESES			
FECHA DE INICIO:	20 DE MARZO DE 2024			
FECHA DE SUSPENSIÓN Y REINICIACIÓN:	N.A.			
FECHA DE TERMINACION:	19 DE SEPTIEMBRE DE 2026			

[Handwritten signature]



**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE
PAÚL GARZÓN - HUILA**
NIT: 891.180.026-5

FECHA DE LA PRESENTE ACTA:	30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	
PERIODO QUE COMPRENDE LA PRESENTE ACTA:	01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	
PRESENTES HOY:	NOMBRE:	WILLIAM ALEXANDER POLO POLANIA
	EN CALIDAD DE:	R.L CONSORCIO SAN VICENTE
	NOMBRE	ARGELIO CERQUERA ARAUJO
	EN CALIDAD DE	R.L CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES
	NOMBRE:	MARIA ISABEL MEDINA
	EN CALIDAD DE:	SUPERVISIÓN DEL CONTRATO

2. ANEXO FINANCIERO	
GENERALIDADES DEL CONTRATO	
Numero de contrato	090 de 2024
Contratista	CONSORCIO SAN VICENTE
Nit contratista	901785549-8
Objeto del contrato	CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 090 DE 2024 SUSCRITO ENTRE LA E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DE GARZON - HUILA Y EL CONSORCIO SAN VICENTE
Fecha de suscripción del contrato	ENERO 4 DE 2024
Plazo de ejecución del contrato	30 meses
Fecha de inicio del contrato	MARZO 20 DE 2024
Valor del contrato	\$ 86,899,134,742.00
Interventor	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES
SITUACION FINANCIERA DEL CONTRATO	
Valor total del contrato	\$ 86,899,134,742.00
Valor pagado en calidad de anticipo o pago anticipado	\$ 26,069,740,422.00
Valor pagado o causado a la fecha acta #1	\$ 208,905,712.00
Valor pagado o causado a la fecha acta #2	\$ 719,606,764.00
Valor acta periodo certificado	\$ 882,800,683.00
Amortización del anticipo	\$ 264,840,204.90
Valor final acta periodo certificado	\$ 617,960,478.10
Retención de garantía 10%	\$ 88,280,068.30
valor neto a pagar	\$ 529,680,409.80
Saldo por ejecutar del contrato	\$ 59,018,081,161.00



3. CUMPLIMIENTO (PAGOS A SALUD, PENSIÓN, RIESGOS Y PARAFISCALES)

Que el CONSORCIO SAN VICENTE contratista, se encuentra al día en el pago de los aportes en salud, pensión y ARL, según las planillas de septiembre de 2024 anexas a este documento con los siguientes valores:

PLANILLA No 9475730495 APORTES EN LINEA – CONSORCIO SAN VICENTE

Total Planilla mes Septiembre 2024	Salud 12,5%	\$ 1.926.500
	Pensión 16 %	\$ 7.585.000
	ARL 6.96%	\$ 3.258.900
Total \$ 14.646.300	CCF(Comfamiliar)	\$ 1.875.900

4. RECIBO A SATISFACCIÓN (POR PARTE DE LA INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN)

1. El contrato arriba descrito se viene desarrollando de conformidad con lo pactado en el mismo, en el cual se efectuaron las actividades objeto del contrato.
2. Que en ejecución del contrato se autorizan el siguiente pago: **Acta Parcial No. 3** por un valor de **\$882,800,683.00** sin amortizar anticipo, el valor amortizar del anticipo es de **\$264,840,204.90** Una vez amortizado el anticipo el valor neto a pagar es de **SEISCIENTOS DIECISIETE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS CON DIEZ CENTAVOS MCTE. (\$617,960,478.10)**
3. Que las partes contratantes se encuentran cumpliendo con lo pactado, por lo que de común acuerdo imparten la aprobación a la presente acta parcial No 03.

MARIA ISABEL MEDINA OSORIO
SUPERVISORA

JOAN ERNESTO PALACIOS YUNDA
R.L HARCOL INGENIERIA S.A.S
APOYO TECNICO A LA SUPERVISIÓN

WILLIAM ALEXANDER POLO POLANIA
R.L CONSORCIO SAN VICENTE
CONTRATISTA

ARGELIO CERQUERA ARAUJO
R.L CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES
INTERVENTORIA



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE
PAÚL GARZÓN - HUILA
NIT: 891.180.026-5

**LA SUSCRITA SUPERVISORA DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA EN LA MODALIDAD
DE INTERVENTORIA No.091 DE 2024**

CERTIFICA

Que recibimos del CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES identificado con Nit. No. 901.785.559-1, el Acta Parcial de Obra #3 que corresponde a la obra ejecutada del 1 al 30 de septiembre de 2024 por el CONSORCIO SAN VICENTE identificado con Nit. No.901.785.549-8, por valor de OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS (\$882.800.683.00) M/CTE.

Que se de conformidad con las memorias de cálculo y los documentos soporte, presentados y debidamente aprobados por Interventoría, se da viabilidad para que la E.SE. proceda a realizar el pago correspondiente del ACTA PARCIAL DE OBRA #3 del Contrato de Obra Pública No.090 de 2024.

Que la medición de cantidades de los ítems incluidos y el seguimiento tanto de obra como de calidad de materiales y ensayos de laboratorios son responsabilidad del interventor y el contratista de obra, de conformidad con sus compromisos contractuales.

Atentamente,

MARIA ISABEL MEDINA OSORIO


Supervisora

E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL
GARZÓN - HUILA

Proyectó y revisó:

JOAQUÍN ERNESTO PALACIOS YUNDA
R.L. HARCOL INGENIERIA S.A.S
Apoyo a la Supervisión

Pág.1/1

**CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES
EN CALIDAD DE INTERVENTOR****C E R T I F I C A:**


Que el **CONSORCIO SAN VICENTE**, identificado con Nit. No. 901.785.549-8, cumplió a satisfacción con el objeto, obligaciones y plazo de ejecución consignados en el Contrato de Obra Pública No. 090 de 2024, cuyo objeto consiste en: **"CONSTRUCCIÓN DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE GARZÓN - HUILA"**.

Que, de igual forma el contratista ha acreditado y aportado el pago de los aportes a la seguridad social Integral y parafiscal en los montos y plazos establecidos verificando el cumplimiento conforme a lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

En razón a ello, autorizo el pago conforme al siguiente detalle:

No. de Pago:	Corte Parcial de Obra No. 03
Periodo o Mes:	01 Septiembre de 2024 - 31 Septiembre de 2024
Valor a Cancelar:	\$ 882'800.683 PESOS MCTE (OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE)

Se expide en el Municipio de Garzón - Huila, a los 31 días del mes de septiembre de 2024.


Nombre: Ing. ARGELIO CERQUERA ARAUJO
Cargo: REPRESENTANTE LEGAL

Elaboró: Edgar Solórzano Medina / Director de Interventoría

ANEXOS			
• Informe de actividades	x	• Soporte magnético	
• Soportes pago de Seguridad Social y Parafiscales	X	• Entrada de Almacén	
Persona natural: Planilla y recibo de caja.		• Factura Comercial	X
Persona Jurídica: Certificación Representante Legal o Revisor Fiscal	X		



INFORME DE GESTIÓN MENSUAL SEPTIEMBRE DE 2024.

**REVISIÓN, VERIFICACIÓN, MODIFICACIÓN
Y APROBACIÓN DE DOCUMENTOS**

**"CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E HOSPITAL DEPARTAMNETAL SAN
VICENTE DE PAUL DEL MUNUICIO DE GARZON-HUILA"**

CONTROL DE REVISIÓN

VERSIÓN No.	No. PAGINAS	FECHA	REVISO	APROBÓ	DESCRIPCIÓN DE LA REVISIÓN
00	14	agosto	Ing. Zaida Carine Aljure Naranjo		Informe de gestión agosto de 2024

1. Tabla de contenido

1. INTRODUCCIÓN.....	4
2. INFORMACION FINANCIERA.....	5
3. DESCRPCION DE ACTIVIDADES PRESENTE PERIODO	6
4. CERTIFICADOS Y RESULTADOS DE LABORATORIO	15
5. ASPECTOS RELEVANTES EN EL PRESENTE PERIODO	15
6. CONCLUSIONES.....	17

1. INTRODUCCIÓN

Bajo el contrato de obra pública N° 090 de 2024 “**CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZON-HUILA** “. Nos permitimos describir las obras a ejecutar en el proyecto en referencia

Localización del proyecto.

DIRECCIÓN: CALLE 7 N°14-69

MUNICIPIO: Garzón departamento del Huila



2. INFORMACION FINANCIERA

2.1 ESTADO DEL CONTRATO DE OBRA

Numero de contrato	090 DE 2024
Fecha de suscripción	04/01/2024
Organización contratante	E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL GARZON HUILA
Proyecto	E.S.E HOSPITAL SAN VICENTE D EPAUL
Objeto del contrato	"CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E HOSPITAL DEPARTAMNETAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNUICIO DE GARZON-HUILA"
Domicilio contractual	CR 4 No 2-85 Zona Industrial vía palmero
Contratista de obra	CONSORCIO SAN VICENTE
Nit. del contratista de obra	901.785.549-8
Representante legal	WILLAM ALEXANDER POLO POLANIA
CC. del representante legal	7.711.612
Director de obra	ZAIDA CARINE ALJURE NARANJO
Valor del contrato	\$ 86.899.134.742
Plazo de ejecución	30 MESES
Fecha de inicio	20/03/2024
Fecha de Suspensión	N. A
Fecha de Terminación	19/09/2026
Prorroga	N. A
Fecha de reinicio	N. A
Fecha de terminación	N. A

3. DESCRPCION DE ACTIVIDADES PRESENTE PERIODO

En el presente periodo se realizaron actividades en el área del lote A Y B, lote B corresponde a las áreas técnicas dispuestas para sub estación eléctrica y otros servicios, y actividades en lote A, área dispuesta para el edificio asistencial

Lote B

Para el área en referencia se aplicó ultima capa de material granular de mejoramiento de terreno entre vigas de cimentación en edificio 2

En atención a solicitud de la entidad contratante se realiza apoyo en actividad de construcción de cuarto para almacenamiento de cadáveres, en el área contigua a antena de comunicaciones




LOTE A


En este frente de obra se continua con actividades de pilotaje las cuales se desarrollan entre ejes 3 y 6 y AF, en el proceso de pilotaje se continúa evidenciando presencia de material rocoso y nivel freático a partir de -8.5m, medidas tomadas desde el nivel de la terraza de ubicación de la maquina piloteadora

Para el presente periodo se realizó la excavación, amarre de acero para pilotes y vaciado de concreto de 53 pilotes en los ejes 1, 2, 3, 4 5 Y 6 entre ejes AF para el área de lote A edificio asistencial




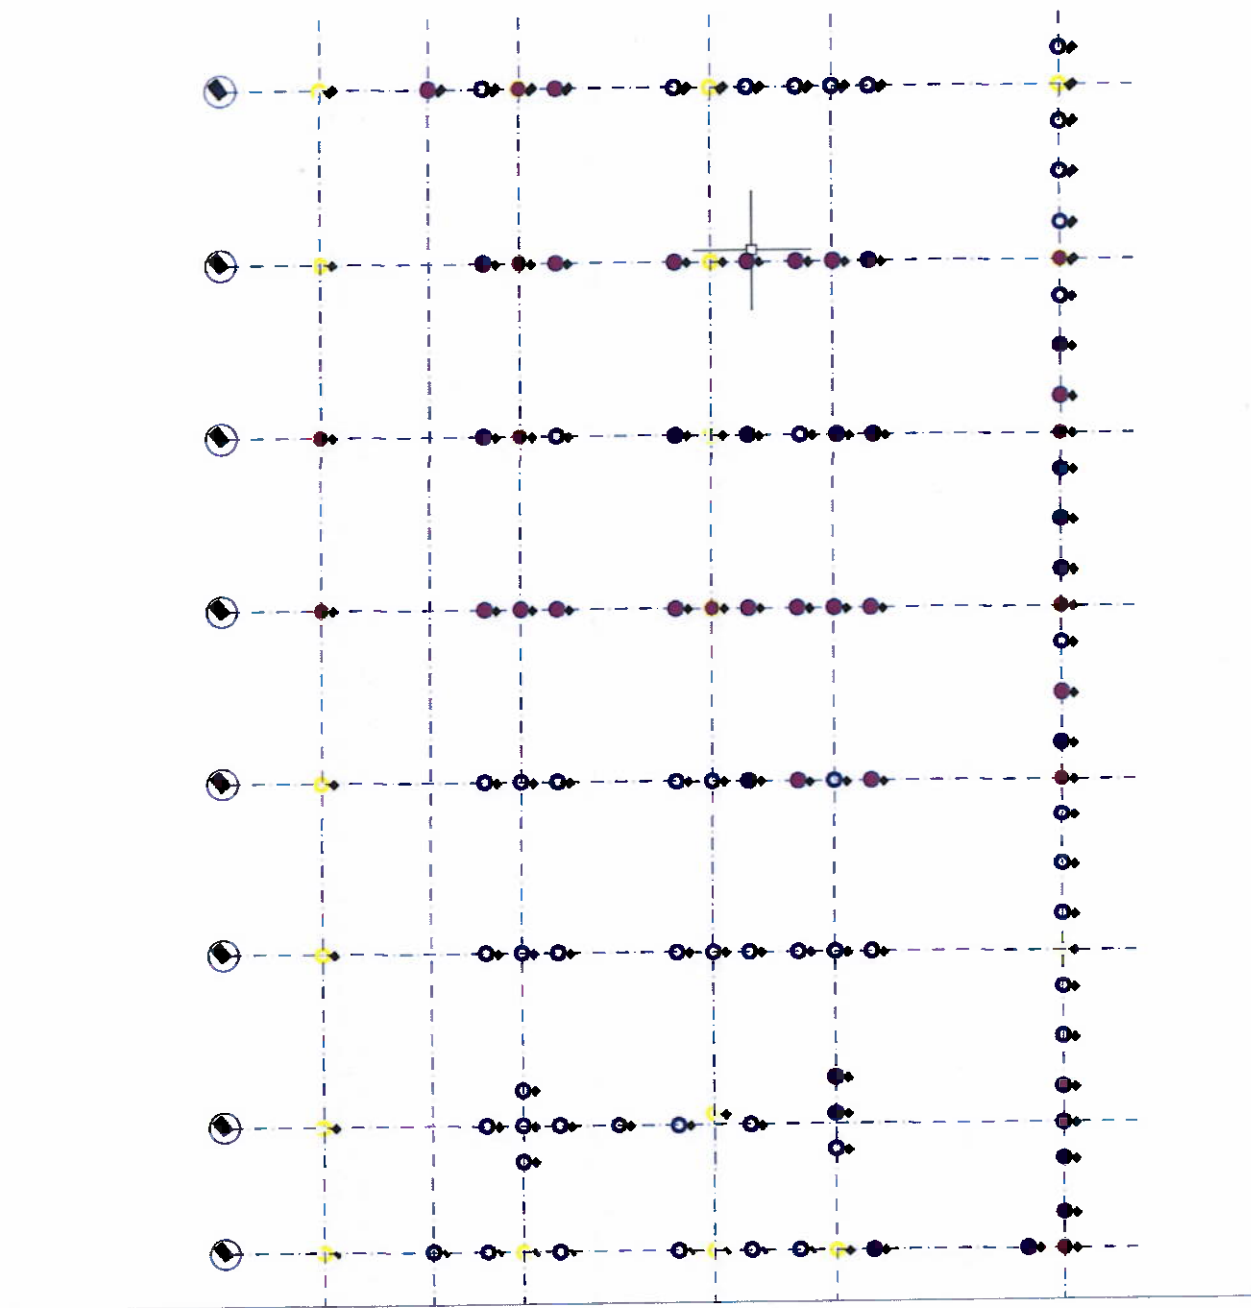

Se realizó la demolición del área de hospitalización, demolición realizada manualmente con el personal del consorcio san vicente, se procedió a realizar el respectivo cerramiento en lamina de zinc (*franja amarilla, ver figura*) a fin de aislar la zona de intervención, según lo acordado con la entidad y la firma interventora

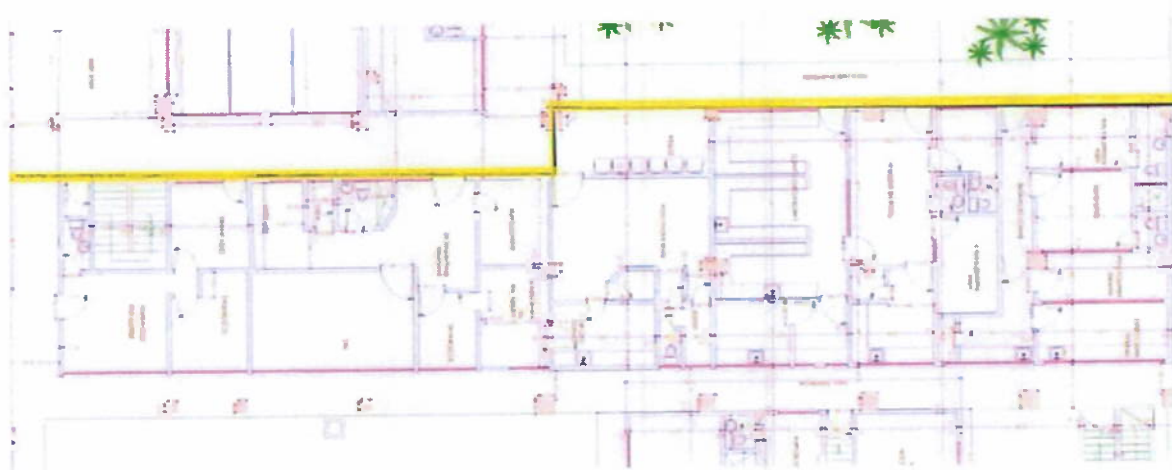

PISO 1

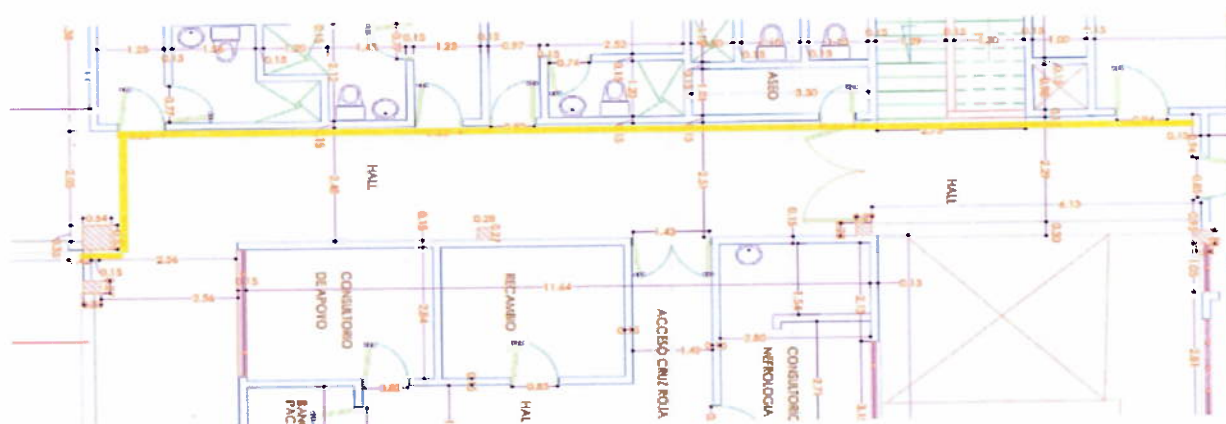

PISO 2






Se realiza demolición de tanques en concreto reforzado, tanques de almacenamiento existentes subterráneo y elevado





Se inicia excavación mecánica para sótano de edificio asistencial, esta actividad se inicia desde el eje 1 entre ejes AF, excavación que se realiza desde la cota cero del proyecto la cual corresponde al 807,10

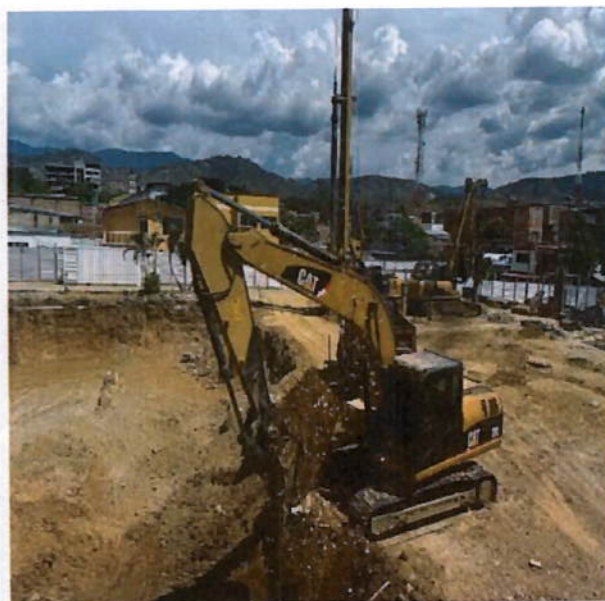

4. Certificados y resultados de laboratorio

Se realizó entrega de informe de resultados pruebas a compresión para concretos vaciados durante el periodo, de igual forma certificados de calidad de acero de refuerzo allegado a obra para edificios 1 y 2 del lote B.

Para el material granular de estabilización de terreno instalado en la cimentación del lote B , se realizó las respectivas pruebas de densidad por el método del cono de arena y se realizó la entrega de resultados de los laboratorio

5. ASPECTOS RELEVANTES EN EL PRESENTE PERIODO

- Se continua a la espera y respuesta de la solicitud por parte del consorcio san vicente en el suministro de la informacion oficial para las diferentes especialidades informacion que refiere a planimetria , detalles y cortes de fachada para los edificios 1, 2 y 3 del lote B
- Se dio inicio a la labor de demolicion del edificio de hospitalizacion , según los parametyora acordado con la supervison del contrato y firma interventora a fin de garatizar las franjas de seguridad que requiere la excvacion del sotano, los cuales estan estipulados en el estudio de suelos entregado por la firma consultora
- Se entregó por parte del consorcio san vicente la documnetacion correspondiente a la torre grua a implementar en el poryecto , asi miso planimetría apara la ubicación de la torre grua
- Durante el perdio el cierre de vias por el paro nacional caminero afecto el suministro de concreto para el vaciado de concreto de pilotes , en el cual no se desarrollaron labores
- Solicitud de aclaración muro panatlla sotano edificio asistencial entre ejes 4-7 sobre F , long 15.5m
- Por parte del consorcio san vicente se encuentra a la espera de la viabilidad de la propuesta presentada para el arte de la valla informativa del proyecto , a fin de proceder al proceso de fabricación e instalación
- Se realizó entrega a la supervison de la matriz solicitada para cargue de sistema de gestion gesproit por parte de la entidad

- Se realiza entrega por parte del consorcio san vicente de documnetos y calculos estructurales a fin se genere aclaraciones estructurales y consideraciones pertinentes en lo referente al edificio asitencial de siete piso
- Se solicita por parte del consorcio san vicente caracterización de aguas a la entrada de la ptar , afin de establecer los parametros que requiere la planta que esta involucrada en la ejecucion del proyecto
- Se remite por parte del consorcio san vicente balance de cimentacion y estructura edificio de siete piso lote A , y edificios 1, 2, y 3 del lote B , a fin que sean verificados a la espera de consideraciones por parte de la firma interventora

6. CONCLUSIONES.

En el presente periodo se avanzó en la construcción de pilotes para el edificio asistencial que se ubicará en el lote A, proceso de cimentación que avanza en un 70% de ejecución

Se continua con el desarrollo de actividades en lote A Y B, los cuales corresponden a edificio asistencial y sub estación eléctrica respectivamente

INFORME DE PILOTES

OBRA: "CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA". ID. PILOTE
FECHA 21-09-2024


1. INFORMACION DE DISEÑO.

DIAMETRO (m)	0.50	LONG. EXCAVACION (m)	12.37	LONG. REFUERZO Canasta(m)	9.5	LONG. DESCABECE (m)	0.8	TIPO PILOTE	FRICCION
VOLUMEN TEORICO (m3)	1.86	COTA DE PROFUNDIDAD EXCAVACION	793.65	COTA SUP. REFUERZO	803.25	COTA DESCABECE		ESPECIFICACION PILOTE	

2. REVISIONES PREVIAS. LOCALIZACION

COORDENADAS		EXCAVACIÓN		
N	E	FECHA	HR INICIO	HR FIN
		21/09/2024	7:15 am	10:50 am

3. EJECUCION.

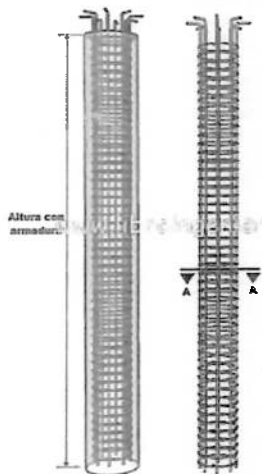

COTA TERRENO NATURAL	806.02
COTA INFERIOR EXCAVACION	793.65
COTA SUPERIOR ACERO	803.25
COTA SUPERIOR CONCRETO	
LONGITUD EXCAVACION (M)	12.37
LONGITUD EFECTIVA (M)	
ALTURA PARA DESCABECE (M)	0.80
VOLUMEN EXCAVACION (M3)	2.43
TIPO DE CONCRETO Y RESISTENCIA PSI	TREMIE DE 4000 PSI
VOLUMEN TEORICO (M3)	1.86
VOLUMEN REAL APLICADO (M3)	

4. SEGUIMIENTO PRUEBAS DE RESISTENCIA

No REMISION	702	No MIXER	639 salto	OBSERVACIONES SLUMP:
ASENTAMIENTO O SLUMP		CARRO 1	9 1/2"	9 1/2"
		CARRO 2		
		CARRO 3	21/09/24 11:30 am	
		CARRO 4	11:50 am	

5. RESULTADOS DE ENSAYOS / RESISTENCIA CILINDROS

No DE MUESTRA	RESULTADOS	7 DIAS	14 DIAS	28 DIAS	PROMEDIO

OBSERVACIONES GENERALES: Se encuentra 1002 nivel -10.50 hasta -12.37m, nivel ficticio -8.30m (carotido -12.37m)

FECHA
TOPOGRAFIA

FECHA
CONTRATISTA

FECHA
INTERVENTORIA

INFORME DE PILOTES

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA".

ID. PILOTE

FECHA

01-10-2024


1. INFORMACION DE DISEÑO.

DIAMETRO (m)	0.50	LONG. EXCAVACION (m)	12.35	LONG. REFUERZO Canasta (m)	9.5	LONG. DESCABECE (m)	0.8	TIPO PILOTE	FRICCION
VOLUMEN TEORICO (m3)	1.86	COTA DE PROFUNDIDAD EXCAVACION	793.65	COTA SUP. REFUERZO	803.25	COTA DESCABECE		ESPECIFICACION PILOTE	

2. REVISIONES PREVIAS. LOCALIZACION

COORDENADAS		EXCAVACIÓN		
N	E	FECHA	HR INICIO	HR FIN
		1/10/24	7:11 am	11:40 am

3. EJECUCION.

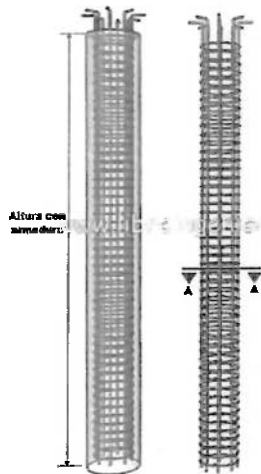

COTA TERRENO NATURAL	806.00
COTA INFERIOR EXCAVACION	793.65
COTA SUPERIOR ACERO	803.25
COTA SUPERIOR CONCRETO	
LONGITUD EXCAVACION (M)	12.35
LONGITUD EFECTIVA (M)	
ALTURA PARA DESCABECE (M)	0.80
VOLUMEN EXCAVACION (M3)	2.42
TIPO DE CONCRETO Y RESISTENCIA PSI	TREMIE DE 4000 PSI
VOLUMEN TEORICO (M3)	1.86
VOLUMEN REAL APLICADO (M3)	

4. SEGUIMIENTO PRUEBAS DE RESISTENCIA

No REMISION	297	No MIXER	203 de la	OBSERVACIONES SLUMP:	10"
ASENTAMIENTO O SLUMP		CARRO 1		VACIADO CONCRETO	
		CARRO 2			
		CARRO 3			
		CARRO 4			
		FECHA	HR INICIO	HR FIN	
		01/10/24	6:30 pm	6:50 pm	

5. RESULTADOS DE ENSAYOS / RESISTENCIA CILINDROS

No DE MUESTRA	RESULTADOS	7 DIAS	14 DIAS	28 DIAS	PROMEDIO

OBSERVACIONES GENERALES: se encuentra poca nivel -2.5m hasta 3.5m nivel
poco -2.5m, principalmente poca nivel -9m hasta
-12.35m (hasta 3.5m)

FECHA
TOPOGRAFIA Wilson
Mendez

FECHA
CONTRATISTA Jaibeth
Gomez

FECHA
INTERVENTORIA Jair Lozano

FECHA

INFORME DE PILOTES

OBRA: "CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA". ID. PILOTE
FECHA


1. INFORMACION DE DISEÑO.

DIAMETRO (m)	0.50	LONG. EXCAVACION (m)	12.32	LONG. REFUERZO Canasta (m)	9.5	LONG. DESCABECE (m)	0.8	TIPO PILOTE	FRICCION
VOLUMEN TEORICO (m ³)	1.86	COTA DE PROFUNDIDAD EXCAVACION	793.65	COTA SUP. REFUERZO	803.25	COTA DESCABECE		ESPECIFICACION PILOTE	

2. REVISIONES PREVIAS. LOCALIZACION

COORDENADAS		EXCAVACIÓN		
N	E	FECHA	HR INICIO	HR FIN
		01/06/2014	12:00 pm	3:30 pm

3. EJECUCION.

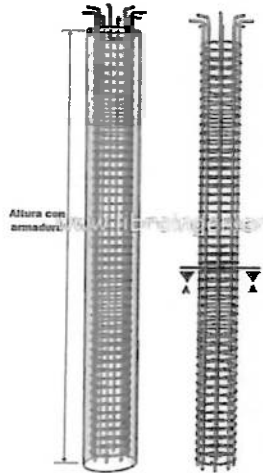

COTA TERRENO NATURAL	803.25
COTA INFERIOR EXCAVACION	793.65
COTA SUPERIOR ACERO	803.25
COTA SUPERIOR CONCRETO	
LONGITUD EXCAVACION (M)	12.32
LONGITUD EFECTIVA (M)	
ALTURA PARA DESCABECE (M)	0.80
VOLUMEN EXCAVACION (M3)	2.42
TIPO DE CONCRETO Y RESISTENCIA PSI	TREMIE DE 4000 PSI
VOLUMEN TEORICO (M3)	1.86
VOLUMEN REAL APLICADO (M3)	

4. SEGUIMIENTO PRUEBAS DE RESISTENCIA

No REMISION	297	No MIXER	733 5/10	OBSERVACIONES SLUMP:	70"
ASENTAMIENTO O SLUMP		CARRO 1	10"	VACIADO CONCRETO	
		CARRO 2			
		CARRO 3			
		CARRO 4			
		FECHA	HR INICIO	HR FIN	
		01/06/2014	1:59 pm	7:05 pm	

5. RESULTADOS DE ENSAYOS / RESISTENCIA CILINDROS

No DE MUESTRA	RESULTADOS	7 DIAS	14 DIAS	28 DIAS	PROMEDIO

OBSERVACIONES GENERALES: Se excavó 10.32 metros - 4.50 hasta - en nivel
fondo - 2.80m, nuevamente 10.32 - 11.11 hasta - 12.32m
(concreto 4.82 m)

FECHA
TOPOGRAFIA Wilson Mardel

FECHA
CONTRATISTA Jarbeth Goral

FECHA
INTERVENTORIA Jairo Lirano

FECHA

INFORME DE PILOTES

OBRA: "CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA".

ID. PILOTE
FECHA


1. INFORMACION DE DISEÑO.

DIAMETRO (m)	0.50	LONG. EXCAVACION (m)	11.43	LONG. REFUERZO Canasta (m)	9.5	LONG. DESCABECE (m)	0.8	TIPO PILOTE	FRICCION
VOLUMEN TEORICO (m3)	1.86	COTA DE PROFUNDIDAD EXCAVACION	793.65	COTA SUP. REFUERZO	803.25	COTA DESCABECE		ESPECIFICACION PILOTE	

2. REVISIONES PREVIAS. LOCALIZACION

COORDENADAS		FECHA	HR INICIO	HR FIN
N		03/10/2014	3:00 pm	4:40 pm
E		04/10/2014		

3. EJECUCION.

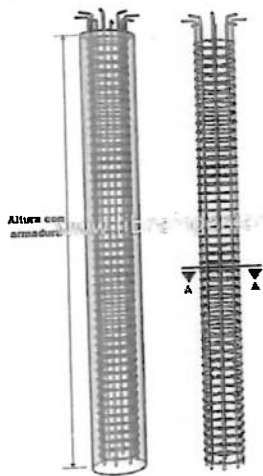

COTA TERRENO NATURAL	805.08
COTA INFERIOR EXCAVACION	793.65
COTA SUPERIOR ACERO	803.25
COTA SUPERIOR CONCRETO	
LONGITUD EXCAVACION (M)	11.43
LONGITUD EFECTIVA (M)	
ALTURA PARA DESCABECE (M)	0.80
VOLUMEN EXCAVACION (M3)	2.24
TIPO DE CONCRETO Y RESISTENCIA PSI	TREMIE DE 4000 PSI
VOLUMEN TEORICO (M3)	1.86
VOLUMEN REAL APLICADO (M3)	

4. SEGUIMIENTO PRUEBAS DE RESISTENCIA

No REMISION	322	No MIXER	764 x 116	OBSERVACIONES SLUMP:
ASENTAMIENTO O SLUMP		CARRO 1		
		CARRO 2		
		CARRO 3		
		CARRO 4		
		FECHA	HR INICIO	HR FIN
		04/10/14	2:56 pm	3:12 pm

5. RESULTADOS DE ENSAYOS / RESISTENCIA CILINDROS

No DE MUESTRA	RESULTADOS	7 DIAS	14 DIAS	28 DIAS

OBSERVACIONES GENERALES: Se colocó la losa de las bscas finales a las 11:30 hrs. Se realizó el llenado de los cilindros a las 12:00 hrs. Se realizó el curado de los cilindros a las 12:00 hrs. Se realizó el curado de los cilindros a las 12:00 hrs.

FECHA
TOPOGRAFIA Wilson Mendez

FECHA
CONTRATISTA Japheth Gomez

FECHA
INTERVENTORIA Jairo Loran O

FECHA

INFORME DE PILOTES

OBRA: "CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA".

ID. PILOTE
FECHA


1. INFORMACION DE DISEÑO.

DIAMETRO (m)	0.50	LONG. EXCAVACION (m)	11.42	LONG. REFUERZO Canasta(m)	9.5	LONG. DESCABECE (m)	0.8	TIPO PILOTE	FRICCION
VOLUMEN TEORICO (m3)	1.86	COTA DE PROFUNDIDAD EXCAVACION	793.65	COTA SUP. REFUERZO	803.25	COTA DESCABECE		ESPECIFICACION PILOTE	

2. REVISIONES PREVIAS. LOCALIZACION

COORDENADAS		EXCAVACIÓN		
N	E	FECHA	HR INICIO	HR FIN
		02/10/2024	2:17 pm	6:30 pm

3. EJECUCION.

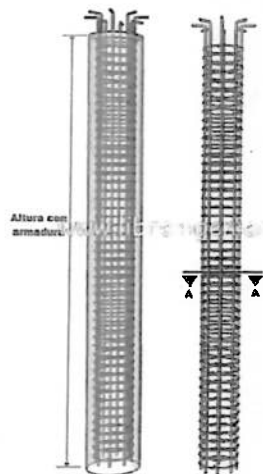

COTA TERRENO NATURAL	805.07
COTA INFERIOR EXCAVACION	793.65
COTA SUPERIOR ACERO	803.25
COTA SUPERIOR CONCRETO	
LONGITUD EXCAVACION (M)	11.42
LONGITUD EFECTIVA (M)	
ALTURA PARA DESCABECE (M)	0.80
VOLUMEN EXCAVACION (M3)	2.24
TIPO DE CONCRETO Y RESISTENCIA PSI	TREMIE DE 4000 PSI
VOLUMEN TEORICO (M3)	1.86
VOLUMEN REAL APLICADO (M3)	

4. SEGUIMIENTO PRUEBAS DE RESISTENCIA

No REMISION	3509	No MIXER	745 pm 02/10	OBSERVACIONES SLUMP:	
ASENTAMIENTO O SLUMP		CARRO 1	9 1/2"	VACIADO CONCRETO	
		CARRO 2		FECHA	HR INICIO
		CARRO 3		02/10/24	8:22 pm
		CARRO 4			8:14 pm

5. RESULTADOS DE ENSAYOS / RESISTENCIA CILINDROS

No DE MUESTRA	RESULTADOS	7 DIAS	14 DIAS	28 DIAS	PROMEDIO

OBSERVACIONES GENERALES: de encuentro mca nivel -4.50m hasta -8.50m, nivel fijas -2.50m, nivelmente local nivel -40.50 hasta -11.20m (2.24m) (1.92m)

FECHA
TOPOGRAFIA Wilson Mendez

FECHA
CONTRATISTA Jairo Borja

FECHA
INTERVENTORIA Juan Corano

FECHA

INFORME DE PILOTES

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA". ID. PILOTE
FECHA


1. INFORMACION DE DISEÑO.

DIAMETRO (m)	0.50	LONG. EXCAVACION (m)	11.35	LONG. REFUERZO Canasta (m)	9.5	LONG. DESCABECE (m)	0.8	TIPO PILOTE	FRICCION
VOLUMEN TEORICO (m3)	1.86	COTA DE PROFUNDIDAD EXCAVACION	793.65	COTA SUP. REFUERZO	803.25	COTA DESCABECE		ESPECIFICACION PILOTE	

2. REVISIONES PREVIAS. LOCALIZACION

COORDENADAS		EXCAVACIÓN		
N	E	FECHA	HR INICIO	HR FIN
		07/10/2024	3:42 am	4:32 pm

3. EJECUCION.

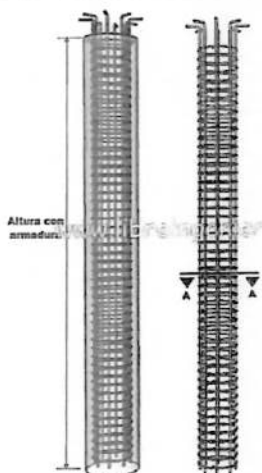

COTA TERRENO NATURAL	805.00
COTA INFERIOR EXCAVACION	793.65
COTA SUPERIOR ACERO	803.25
COTA SUPERIOR CONCRETO	
LONGITUD EXCAVACION (M)	11.35
LONGITUD EFECTIVA (M)	
ALTURA PARA DESCABECE (M)	0.80
VOLUMEN EXCAVACION (M3)	2.23
TIPO DE CONCRETO Y RESISTENCIA PSI	TREMIE DE 4000 PSI
VOLUMEN TEORICO (M3)	1.86
VOLUMEN REAL APLICADO (M3)	

4. SEGUIMIENTO PRUEBAS DE RESISTENCIA

No REMISION		No MIXER		OBSERVACIONES SLUMP:
ASENTAMIENTO O SLUMP		CARRO 1		
		CARRO 2		
		CARRO 3		
		CARRO 4		
		VACIADO CONCRETO		
		FECHA	HR INICIO	HR FIN
		07/10/24	5:05 pm	5:34 pm

5. RESULTADOS DE ENSAYOS / RESISTENCIA CILINDROS

No DE MUESTRA	RESULTADOS	7 DIAS	PROMEDIO

OBSERVACIONES GENERALES: Se muestra los niveles -6m hasta -6.50m nivel final -7.50m para el pilote 102 nivel -7.00m hasta -7.50m (cañon de 0.50m)

[Firma]
FECHA
TOPOGRAFIA Wilson Mendez

[Firma]
FECHA
CONTRATISTA

[Firma]
FECHA
INTERVENTORIA Jairo Lozano

[Firma]

INFORME DE PILOTES

OBRA: "CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA" ID. PILOTE
FECHA


1. INFORMACION DE DISEÑO.

DIAMETRO (m)	0.50	LONG. EXCAVACION (m)	11.37	LONG. REFUERZO Canasta(m)	9.5	LONG. DESCABECE (m)	0.8	TIPO PILOTE	FRICCION
VOLUMEN TEORICO (m ³)	1.86	COTA DE PROFUNDIDAD EXCAVACION	793.65	COTA SUP. REFUERZO	803.25	COTA DESCABECE		ESPECIFICACION PILOTE	

2. REVISIONES PREVIAS. LOCALIZACION

COORDENADAS		EXCAVACIÓN		
N	E	FECHA	HR INICIO	HR FIN
		04/10/2024	10:20 am	5:00 pm

3. EJECUCION.

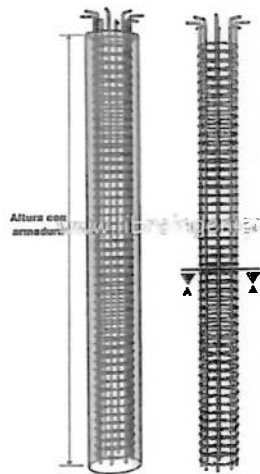

COTA TERRENO NATURAL	803.02
COTA INFERIOR EXCAVACION	793.65
COTA SUPERIOR ACERO	803.25
COTA SUPERIOR CONCRETO	
LONGITUD EXCAVACION (M)	11.37
LONGITUD EFECTIVA (M)	
ALTURA PARA DESCABECE (M)	0.80
VOLUMEN EXCAVACION (M ³)	2.23
TIPO DE CONCRETO Y RESISTENCIA PSI	TREMIE DE 4000 PSI
VOLUMEN TEORICO (M ³)	1.86
VOLUMEN REAL APLICADO (M ³)	

4. SEGUIMIENTO PRUEBAS DE RESISTENCIA

No REMISION	329	No MIXER	760 auto	OBSERVACIONES SLUMP:	
ASENTAMIENTO O SLUMP		CARRO 1	10"	VACIADO CONCRETO	10"
		CARRO 2		FECHA	HR INICIO
		CARRO 3		04/10/24	5:15 pm
		CARRO 4			5:30 pm

5. RESULTADOS DE ENSAYOS / RESISTENCIA CILINDROS

No DE MUESTRA	RESULTADOS	7 DIAS	PROMEDIO

OBSERVACIONES GENERALES: se colocó 10C2 - 3m hasta -7.50m, nuevamente 10C2 - 7m hasta -7.50m, para flectura - 7.50m, nuevamente 10C2 - 11m hasta -11.37m (cantidad 16.7m)

[Firma]
FECHA

TOPOGRAFIA wilson

[Firma]
FECHA

CONTRATISTA Jazbeth Comas

[Firma]
FECHA

INTERVENTORIA Jairo Lozano

[Firma]

INFORME DE PILOTES

OBRA: "CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA". ID. PILOTE _____
FECHA _____


1. INFORMACION DE DISEÑO.

DIAMETRO (m)	0.50	LONG. EXCAVACION (m)		LONG. REFUERZO Canasta (m)	9.5	LONG. DESCABECE (m)	0.8	TIPO PILOTE	FRICCION
VOLUMEN TEORICO (m3)	1.86	COTA DE PROFUNDIDAD EXCAVACION	793.65	COTA SUP. REFUERZO	803.25	COTA DESCABECE		ESPECIFICACION PILOTE	

2. REVISIONES PREVIAS. LOCALIZACION

COORDENADAS		EXCAVACIÓN		
N	E	FECHA	HR INICIO	HR FIN
		02/10/2024	2:03 PM	4:10 PM
		09/10/2024	6:10 PM	7:30 PM

3. EJECUCION.

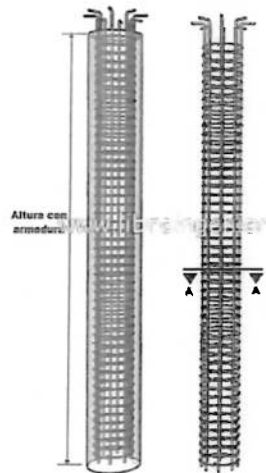

COTA TERRENO NATURAL	805.01
COTA INFERIOR EXCAVACION	793.65
COTA SUPERIOR ACERO	803.25
COTA SUPERIOR CONCRETO	
LONGITUD EXCAVACION (M)	11.36
LONGITUD EFECTIVA (M)	
ALTURA PARA DESCABECE (M)	0.80
VOLUMEN EXCAVACION (M3)	2.23
TIPO DE CONCRETO Y RESISTENCIA PSI	TREMIE DE 4000 PSI
VOLUMEN TEORICO (M3)	1.86
VOLUMEN REAL APLICADO (M3)	

4. SEGUIMIENTO PRUEBAS DE RESISTENCIA

No REMISION		No MIXER		OBSERVACIONES SLUMP:
ASENTAMIENTO O SLUMP		CARRO 1		
		CARRO 2		
		CARRO 3		
		CARRO 4		
		VACIADO CONCRETO		
		FECHA	HR INICIO	HR FIN
		09/10/24	3:51 PM	4:11 PM

5. RESULTADOS DE ENSAYOS / RESISTENCIA CILINDROS

No DE MUESTRA	RESULTADOS	7 DIAS	14 DIAS	28 DIAS	PROMEDIO

OBSERVACIONES GENERALES: se encuentra 102 nivel - con nivel de estria - 9m. nuevamente 100 - 11m hasta 11.36m (12m de estria)

[Firma]
FECHA
TOPOGRAFIA: Wilson Mander

[Firma]
FECHA
CONTRATISTA

[Firma]
FECHA
INTERVENTORIA: Jair Lozano

[Firma]

INFORME DE PILOTES

OBRA: "CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA".

ID. PILOTE

FECHA

11-10-2024


1. INFORMACION DE DISEÑO.

DIAMETRO (m)	0.50	LONG. EXCAVACION (m)	11.57	LONG. REFUERZO Canasta (m)	9.5	LONG. DESCABECE (m)	0.8	TIPO PILOTE	FRICCION
VOLUMEN TEORICO (m3)	1.86	COTA DE PROFUNDIDAD EXCAVACION	793.65	COTA SUP. REFUERZO	803.25	COTA DESCABECE		ESPECIFICACION PILOTE	

2. REVISIONES PREVIAS. LOCALIZACION

COORDENADAS		EXCAVACIÓN		
N	E	FECHA	HR INICIO	HR FIN
		09/10/2024	7:20 pm	3:26 pm

3. EJECUCION.

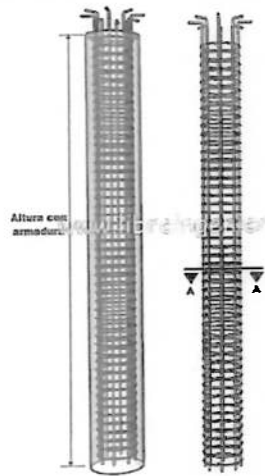

COTA TERRENO NATURAL	805.22.
COTA INFERIOR EXCAVACION	793.65
COTA SUPERIOR ACERO	803.25
COTA SUPERIOR CONCRETO	
LONGITUD EXCAVACION (M)	11.57.
LONGITUD EFECTIVA (M)	
ALTURA PARA DESCABECE (M)	0.80
VOLUMEN EXCAVACION (M3)	2.27.
TIPO DE CONCRETO Y RESISTENCIA PSI	TREMIE DE 4000 PSI
VOLUMEN TEORICO (M3)	1.86
VOLUMEN REAL APLICADO (M3)	

4. SEGUIMIENTO PRUEBAS DE RESISTENCIA

No REMISION	354	No MIXER	397 Jello	OBSERVACIONES SLUMP:	9"
ASENTAMIENTO O SLUMP		CARRO 1	9"	VACIADO CONCRETO	
		CARRO 2		FECHA	HR INICIO
		CARRO 3		11/10/24	12:47 pm
		CARRO 4			12:58 pm

5. RESULTADOS DE ENSAYOS / RESISTENCIA CILINDROS

No DE MUESTRA	RESULTADOS	7 DIAS	14 DIAS	28 DIAS	PROMEDIO

OBSERVACIONES GENERALES: Se incrementa cada nivel -15cm hasta -1m, nivel final -7m, aproximadamente, cada nivel -10.80 hasta -11.72m (Cabeza 1.27m)

FECHA

TOPOGRAFIA Wilson Mandel

FECHA

CONTRATISTA

FECHA

INTERVENTORIA Jairo Lozano

[Firma]

INFORME DE PILOTES

OBRA: "CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA".

ID. PILOTE
FECHA


1. INFORMACION DE DISEÑO.

DIAMETRO (m)	0.50	LONG. EXCAVACION (m)	11.67	LONG. REFUERZO Canasta (m)	9.5	LONG. DESCABECE (m)	0.8	TIPO PILOTE	FRICCION
VOLUMEN TEORICO (m3)	1.86	COTA DE PROFUNDIDAD EXCAVACION	793.65	COTA SUP. REFUERZO	803.25	COTA DESCABECE		ESPECIFICACION PILOTE	

2. REVISIONES PREVIAS. LOCALIZACION

COORDENADAS		EXCAVACIÓN		
N	E	FECHA	HR INICIO	HR FIN
		07/10/2014	10:00 am	4:53 pm
		21/10/2014	9:37 am	4:44 pm

3. EJECUCION.

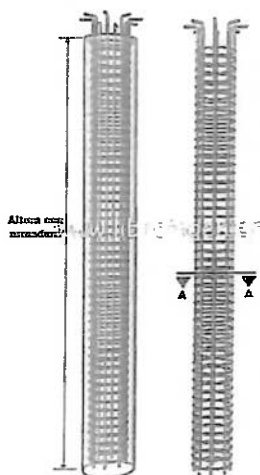

COTA TERRENO NATURAL	805.37
COTA INFERIOR EXCAVACION	793.65
COTA SUPERIOR ACERO	803.25
COTA SUPERIOR CONCRETO	
LONGITUD EXCAVACION (M)	11.67
LONGITUD EFECTIVA (M)	
ALTURA PARA DESCABECE (M)	0.80
VOLUMEN EXCAVACION (M3)	2.29
TIPO DE CONCRETO Y RESISTENCIA PSI	TREMIE DE 4000 PSI
VOLUMEN TEORICO (M3)	1.86
VOLUMEN REAL APLICADO (M3)	2.29

4. SEGUIMIENTO PRUEBAS DE RESISTENCIA

No REMISION		No MIXER		OBSERVACIONES SLUMP:
ASENTAMIENTO O SLUMP	CARRO 1	VACIADO CONCRETO		
	CARRO 2	FECHA	HR INICIO	HR FIN
	CARRO 3	22/10/14	5:11 pm	5:20 pm
	CARRO 4			

5. RESULTADOS DE ENSAYOS / RESISTENCIA CILINDROS

No DE MUESTRA	RESULTADOS	7 DIAS	14 DIAS	28 DIAS	PROMEDIO

OBSERVACIONES GENERALES: Se ejecutó pilote para nivel -6.40m, nivel práctico -8.50, aumentamos 10cm más hasta -11.67m

Wilson F. Múndez
FECHA
TOPOGRAFIA Wilson Múndez

Victor Pinto
FECHA
CONTRATISTA

FECHA
INTERVENTORIA Juan Lozano

108

INFORME DE PILOTES

OBRA: "CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA".

ID. PILOTE
FECHA


1. INFORMACION DE DISEÑO.

DIAMETRO (m)	0.50	LONG. EXCAVACION (m)	11.76	LONG. REFUERZO Canasta(m)	9.5	LONG. DESCABECE (m)	0.8	TIPO PILOTE	FRICCION
VOLUMEN TEORICO (m3)	1.86	COTA DE PROFUNDIDAD EXCAVACION	793.65	COTA SUP. REFUERZO	803.25	COTA DESCABECE		ESPECIFICACION PILOTE	

2. REVISIONES PREVIAS. LOCALIZACION

COORDENADAS		EXCAVACIÓN		
		FECHA	HR INICIO	HR FIN
N		08/10/2014	7:08 AM	4:16 PM
E		24/10/2014	8:02 AM	7:56 PM

3. EJECUCION.

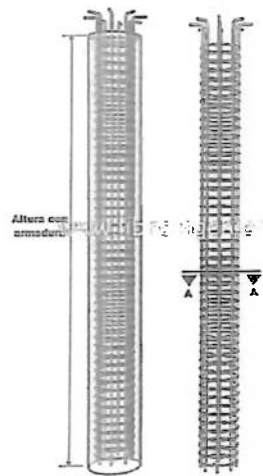

COTA TERRENO NATURAL	805.41
COTA INFERIOR EXCAVACION	793.65
COTA SUPERIOR ACERO	803.25
COTA SUPERIOR CONCRETO	
LONGITUD EXCAVACION (M)	11.76.
LONGITUD EFECTIVA (M)	
ALTURA PARA DESCABECE (M)	0.80
VOLUMEN EXCAVACION (M3)	2.30
TIPO DE CONCRETO Y RESISTENCIA PSI	TREMIE DE 4000 PSI
VOLUMEN TEORICO (M3)	1.86
VOLUMEN REAL APLICADO (M3)	2.35

4. SEGUIMIENTO PRUEBAS DE RESISTENCIA

No REMISION		No MIXER		OBSERVACIONES SLUMP:
ASENTAMIENTO O SLUMP		CARRO 1		
		CARRO 2		
		CARRO 3		
		CARRO 4		
		VACIADO CONCRETO		
		FECHA	HR INICIO	HR FIN
		25/10/2014	2:07 PM	2:47 PM

5. RESULTADOS DE ENSAYOS / RESISTENCIA CILINDROS

No DE MUESTRA	RESULTADOS	7 DIAS	14 DIAS	28 DIAS	PROMEDIO

OBSERVACIONES GENERALES: Se calcula la cota nivel 805.41m, altura 11.76m, cota superior concreto 803.25m, cota superior acero 803.25m, cota inferior excavación 793.65m, cota terreno natural 805.41m.

Wilson F. Méndez
FECHA
TOPOGRAFIA Wilson Méndez

Victor Pinto
FECHA
CONTRATISTA

Javier Borzaga
FECHA
INTERVENTORIA

INFORME DE PILOTES

OBRA: "CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA".

ID. PILOTE
FECHA


1. INFORMACION DE DISEÑO.

DIAMETRO (m)	0.50	LONG. EXCAVACION (m)	11.79	LONG. REFUERZO Canasta(m)	9.5	LONG. DESCABECE (m)	0.8	TIPO PILOTE	FRICCION
VOLUMEN TEORICO (m3)	1.86	COTA DE PROFUNDIDAD EXCAVACION	793.65	COTA SUP. REFUERZO	803.25	COTA DESCABECE		ESPECIFICACION PILOTE	

2. REVISIONES PREVIAS. LOCALIZACION

COORDENADAS		EXCAVACIÓN		
N	E	FECHA	HR INICIO	HR FIN
		05/10/2024	7:45 am	10:30 am
		07/10/2024	7:00 am	10:32 am

3. EJECUCION.

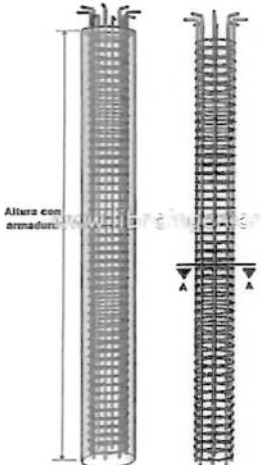	COTA TERRENO NATURAL	808.44
	COTA INFERIOR EXCAVACION	793.65
	COTA SUPERIOR ACERO	803.25
	COTA SUPERIOR CONCRETO	
	LONGITUD EXCAVACION (M)	11.79
	LONGITUD EFECTIVA (M)	
	ALTURA PARA DESCABECE (M)	0.80
	VOLUMEN EXCAVACION (M3)	231.
	TIPO DE CONCRETO Y RESISTENCIA PSI	TREMIE DE 4000 PSI
	VOLUMEN TEORICO (M3)	1.86
	VOLUMEN REAL APLICADO (M3)	

4. SEGUIMIENTO PRUEBAS DE RESISTENCIA

No REMISION		No MIXER		OBSERVACIONES SLUMP:
ASENTAMIENTO O SLUMP	CARRO 1	VACIADO CONCRETO		
	CARRO 2	FECHA	HR INICIO	HR FIN
	CARRO 3	07/10/24	7:47 pm	6:02 pm
	CARRO 4			

5. RESULTADOS DE ENSAYOS / RESISTENCIA CILINDROS

No DE MUESTRA	RESULTADOS	7 DIAS	14 DIAS	28 DIAS	PROMEDIO

OBSERVACIONES GENERALES: se colocaron 10C2 - 2.40m hasta - 2.92m, nivel final - 2.92m, altura máxima 10C2 - 2.92m hasta - 2.92m (12.10m hasta 2.92m)

FECHA
TOPOGRAFIA Wilson mendoza

FECHA
CONTRATISTA Victor Pinto

FECHA
INTERVENTORIA Jairo Lozano

INFORME DE PILOTES

OBRA: "CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA".

ID. PILOTE
FECHA


1. INFORMACION DE DISEÑO.

DIAMETRO (m)	0.50	LONG. EXCAVACION (m)	11.80	LONG. REFUERZO Canasta(m)	9.5	LONG. DESCABECE (m)	0.8	TIPO PILOTE	FRICCION
VOLUMEN TEORICO (m3)	1.86	COTA DE PROFUNDIDAD EXCAVACION	793.65	COTA SUP. REFUERZO	803.25	COTA DESCABECE		ESPECIFICACION PILOTE	

2. REVISIONES PREVIAS. LOCALIZACION

COORDENADAS		EXCAVACIÓN		
N	E	FECHA	HR INICIO	HR FIN
		24/10/2014	9:00 am	4:00 pm

3. EJECUCION.

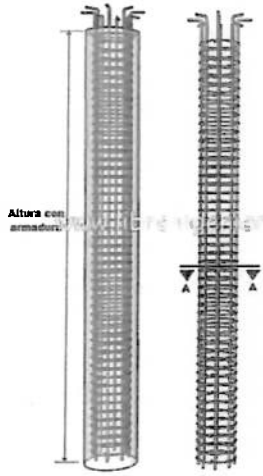	COTA TERRENO NATURAL	803.45
	COTA INFERIOR EXCAVACION	793.65
	COTA SUPERIOR ACERO	803.25
	COTA SUPERIOR CONCRETO	
	LONGITUD EXCAVACION (M)	11.80
	LONGITUD EFECTIVA (M)	
	ALTURA PARA DESCABECE (M)	0.80
	VOLUMEN EXCAVACION (M3)	2.32
	TIPO DE CONCRETO Y RESISTENCIA PSI	TREMIE DE 4000 PSI
	VOLUMEN TEORICO (M3)	1.86
	VOLUMEN REAL APLICADO (M3)	

4. SEGUIMIENTO PRUEBAS DE RESISTENCIA

No REMISION	329	No MIXER	764 sala	OBSERVACIONES SLUMP:
ASENTAMIENTO O SLUMP	CARRO 1	70"	VACIADO CONCRETO 70"	
	CARRO 2			
	CARRO 3			
	CARRO 4			
		FECHA	HR INICIO	HR FIN
		24/10/14	3:35 pm	3:45 pm

5. RESULTADOS DE ENSAYOS / RESISTENCIA CILINDROS

No DE MUESTRA	RESULTADOS	7 DIAS	14 DIAS	28 DIAS	RESULTADOS	PROMEDIO

OBSERVACIONES GENERALES: Se colocó la capa de concreto en la zona de la obra a las 3:30 pm. Se vació a 10.80m de altura hasta 10.80m.

FECHA: 24/10/14

TOPOGRAFIA: Wilson

FECHA: 24/10/14

CONTRATISTA: Jaibeth

FECHA: 24/10/14

INTERVENTORIA: Jairo

INFORME DE PILOTES

OBRA: "CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA".

ID. PILOTE
FECHA


1. INFORMACION DE DISEÑO.

DIAMETRO (m)	0.50	LONG. EXCAVACION (m)	11.83	LONG. REFUERZO Canasta (m)	9.5	LONG. DESCABECE (m)	0.8	TIPO PILOTE	FRICCION
VOLUMEN TEORICO (m3)	1.86	COTA DE PROFUNDIDAD EXCAVACION	793.65	COTA SUP. REFUERZO	803.25	COTA DESCABECE		ESPECIFICACION PILOTE	

2. REVISIONES PREVIAS. LOCALIZACION

COORDENADAS		EXCAVACIÓN		
N	E	FECHA	HR INICIO	HR FIN
		02/10/2024	3:15 pm	6:40 pm
		03/10/2024	7:25 pm	10:56 pm

3. EJECUCION.

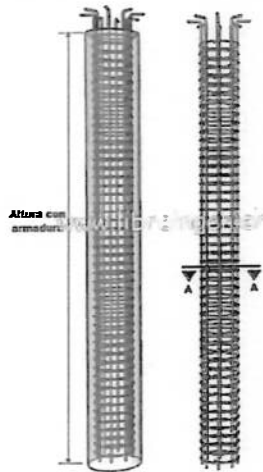

COTA TERRENO NATURAL	805.48
COTA INFERIOR EXCAVACION	793.65
COTA SUPERIOR ACERO	803.25
COTA SUPERIOR CONCRETO	
LONGITUD EXCAVACION (M)	11.83
LONGITUD EFECTIVA (M)	
ALTURA PARA DESCABECE (M)	0.80
VOLUMEN EXCAVACION (M3)	2.32
TIPO DE CONCRETO Y RESISTENCIA PSI	TREMIE DE 4000 PSI
VOLUMEN TEORICO (M3)	1.86
VOLUMEN REAL APLICADO (M3)	

4. SEGUIMIENTO PRUEBAS DE RESISTENCIA

No REMISION	327	No MIXER	757 Jello	OBSERVACIONES SLUMP:
ASENTAMIENTO O SLUMP		CARRO 1	10"	10"
		CARRO 2		
		CARRO 3		
		CARRO 4		
		VACIADO CONCRETO		
		FECHA	HR INICIO	HR FIN
		21/10/24	4:19 pm	5:09 pm

5. RESULTADOS DE ENSAYOS / RESISTENCIA CILINDROS

No DE MUESTRA	RESULTADOS	7 DIAS	RESULTADOS		PROMEDIO
		14 DIAS			
		28 DIAS			

OBSERVACIONES GENERALES: Se encuentra a 200 - 400 m altura - 4.00m nivel ficticio
+ 2.00m nivelmente 8502 nivel - 7.00m altura 11.23m
(2110111 7.33m)

FECHA
TOPOGRAFIA Wilson

FECHA
CONTRATISTA Jazbeth

FECHA
INTERVENTORIA Jairo Lozano

**CONSORCIO SAN VICENTE**

NIT 901785549-8

CR 42 85 ZN INDUSTRIAL KM 3 2 VIA PALERMO

NEVA - HUILA

Una vez aprobada esta factura proforma de venta se emitira la factura electronica

FACTURA PROFORMA DE VENTA**No. 3**

Cliente:	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL GARZON - HUILA	NIT	891180026-5	Fecha	15-nov-24
Razon Social		Tels.	(608) 8332441 ext. 000	Ciudad	GARZON
Direccion:	CALLE 7 14-69 GARZON, HUILA	Email:	gerencia@hospitalsvpgarzon.gov.co		
Nota	CORTE PARCIAL DE OBRA 3				

Codigo	Descripcion	V. Unitario	Cantidad	Descuento	Valor Total
	CORTE PARCIAL DE OBRA No 3 "CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZON - HUILA"	679.077.449	1,00	-	\$ 679.077.449
	ADMINISTRACION		22,00%		\$ 149.397.039
	IMPREVISTOS		3,00%		\$ 20.372.323
	UTILIDAD		5,00%		\$ 33.953.872

Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según Art.774 C.C.

RESUMEN IMPUESTOS			RESUMEN RETENCIONES		
Tarifa	Base	Valor	Tipo Retención	Base	Valor
			Subtotal		
			- Descuento		
			+ IVA		
			- Retencion		
			TOTAL		

AMORTIZACION ANTICIPO 30% : \$ 264.840.204Responsable: Supervisor
CC

Recibido con C.C.:

COMPROBANTE

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
899999034	BANCO DE OCCIDENTE	120593095	1067146732	21/11/2024

Razón Social: **SENA**

Usuario Pagador: **901785549**

Descripción del Pago: **Pago Ordinario - FIC**

Dirección IP: **190.24.89.15**

Su transacción fue APROBADA por la Entidad Financiera

Total Pagado **\$ 2,207,002.00**

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
Pago Ordinario - FIC	1	\$ 2,207,002.00	COP\$ 2,207,002.00

NIT

899999034

Medio de Pago

BANCO DE
OCCIDENTE

No. Transacción

120593095

No. Autorización/CUS

1067146732

Fecha y Hora

21/11/2024

Número de Identificación

901785549

Primer Apellido (si es Persona natural)**Dígito de Verificación (Si es persona**

8

Departamento

HUILA

Dirección de Domicilio

CR 4 2 85 ZN INDUSTRIAL KM 3 2 VIA PALER

Localización

Nacional

Correo electrónico

consorciosanvicente2024@gmail.com

Regional

Huila

Número Licencia de Obra

0

Nombre Obra

HTAL DEPARTAMENTAL

Fecha Terminación Obra

19/10/2026

Tipo FIC

Costo Total de Obra (Sin Aportes)

Mes Periodo a Pagar

10

Costo Total Mano de Obra

882800683.00

Valor Intereses Moratorios

0.00

Aporte SENA

0.00

Primer Nombre ó Razón Social

CONSORCIO SAN VICENTE

Tipo de documento

01

Naturaleza Juridica

01

Ciudad Capital

NEIVA (HUILA)

Ciudad de Domicilio

neiva

Teléfono de Contacto

+57,317 0884254

Código SIIF

3-2-07-1-02-1-04-43

Regional Centros SIIF

36-02-00-041-000000

Número Contrato de Obra

090-2024

Fecha Inicio Obra

20/03/2024

Ciudad de Ejecución de la Obra

GARZON

Año Periodo a Pagar

2024

Costo Total de Obra a Todo Costo

882800683.00

Número de Trabajadores en el Periodo

10

Aporte FIC

2207002.00

Valor del Pago

2207002.00



Banco de Occidente

NIT. 890.300.279-4

CERTIFICADO

Mediante la presente CERTIFICAMOS que nuestro cliente **CONSORCIO SAN VICENTE** identificado con NIT **901.785.549 -8**, es cuenta habiente del Banco de Occidente desde el día 26 de enero de 2024 con la Cuenta Corriente No. 267877108, la cual se encuentra activa y vigente.

Por lo anterior podemos afirmar que la mejor carta de presentación de la empresa, **CONSORCIO SAN VICENTE** es ser un "Cliente activo del Banco de Occidente".

Expedimos esta certificación a **CONSORCIO SAN VICENTE**, hoy 26 de enero del 2024.

Cordial Saludo,

Yesenia Paola Ortiz Rodriguez
Gerente de Relación- Banca Empresas
Vicepresidencia de Empresas

2. Concepto 02 Actualización

4. Número de formulario

14970531870



(415)7707212489984(8020) 000001497053187 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

9 0 1 7 8 5 5 4 9

8

Impuestos y Aduanas de Neiva

1 3

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

1

25. Tipo de documento

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

CONSORCIO SAN VICENTE

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Huila

4 1

40. Ciudad/Municipio

Neiva

0 0 1

41. Dirección principal

CR 4 2 85 ZN INDUSTRIAL KM 3 2 VIA PALERMO

42. Correo electrónico

consorciosanvicente2024@gmail.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

6 0 8 8 7 1 6 8 2 6

45. Teléfono 2

3 1 7 0 8 8 4 2 5 4

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Ocupación

Actividad principal

46. Código

47. Fecha inicio actividad

Actividad secundaria

48. Código

49. Fecha inicio actividad

Otras actividades

50. Código

1

2

51. Código

52. Número establecimientos

4 2 9 0

2 0 2 3 1 2 1 5

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

53. Código

7 1 4 1 6 5 5

07- Retención en la fuente a título de rent

14- Informante de exogena

16- Obligación facturar por ingresos bienes

55 - Informante de Beneficiarios Finales

DOCUMENTO SIN EFECTOS

Usuarios aduaneros

Exportadores

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

55. Forma

56. Tipo

Servicio

1

2

3

57. Modo

58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

X

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2024 - 01 - 05 / 09 : 49: 29

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre POLO POLANIA WILLIAM ALEXANDER

985. Cargo Representante legal Certificado

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14970531870



(415)7707212489984(8020) 000001497053187 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

9 0 1 7 8 5 5 4 9 8

Impuestos y Aduanas de Nueva

1 3

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

☐

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados

67. Sociedades y organismos extranjeros

70. Beneficio

1

65. Fondos

☐

66. Cooperativas

☐

68. Sin personería jurídica

3

69. Otras organizaciones no clasificadas

☐

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 3, 1 2, 1 5	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	9 8	
76. Fecha de registro	2 0 2 3, 1 2, 1 5	
77. No. Matricula mercantil		
78. Departamento	4 1	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde	2 0 2 3, 1 2, 1 5	
81. Hasta	2 0 4 5, 1 2, 3 0	

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1				-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14970531870



(415)7707212489984(8020) 000001497053187 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional
Impuestos y Aduanas de Neiva

14. Buzón electrónico

9 0 1 7 8 5 5 4 9 8

1 3

Representación

98. Representación REPRS LEGAL PRIN	1 8	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 3 1 2 1 5
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan	1 3	101. Número de identificación 7 7 1 1 6 1 2
102. DV	1	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido POLO	105. Segundo apellido POLANIA	106. Primer nombre WILLIAM
107. Otros nombres ALEXANDER	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV
110. Razón social representante legal		
98. Representación REPRS LEGAL SUPL	1 9	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 3 1 2 1 5
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan	1 3	101. Número de identificación 7 9 9 0 5 7 1 8
102. DV		103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido CASTILLO	105. Segundo apellido FAJARDO	106. Primer nombre TELMO
107. Otros nombres ALEXANDER	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV
110. Razón social representante legal		
98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV
103. Número de tarjeta profesional		
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
107. Otros nombres		
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV
103. Número de tarjeta profesional		
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
107. Otros nombres		
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV
103. Número de tarjeta profesional		
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
107. Otros nombres		
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14970531870



(415)7707212489984(8020) 000001497053187 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

9 0 1 7 8 5 5 4 9 8

Impuestos y Aduanas de Neiva

3

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

111. Tipo de documento NIT	112. Número de identificación 3 1 8 3 0 0 3 7 3 2 2	113. DV 8	114. Nacionalidad COLOMBIA	115. Primer apellido 1	116. Segundo apellido 1	117. Primer nombre 1	118. Otros nombres 6 9
119. Razón social PROTELCA INGENIEROS ARQUITECTOS S.A.S	120. Valor capital del socio 289,663,782,473	121. % Participación 3 3	122. Fecha de ingreso 2 0 2 3 1 2 1 5	123. Fecha de retiro			
111. Tipo de documento NIT	112. Número de identificación 3 1 8 9 2 0 0 2 9 8 5	113. DV 5	114. Nacionalidad COLOMBIA	115. Primer apellido 2	116. Segundo apellido 1	117. Primer nombre 1	118. Otros nombres 6 9
119. Razón social CONSTRUSAR SA	120. Valor capital del socio 289,663,782,473	121. % Participación 3 3	122. Fecha de ingreso 2 0 2 3 1 2 1 5	123. Fecha de retiro			
111. Tipo de documento NIT	112. Número de identificación 3 1 9 0 0 0 7 2 6 6 7	113. DV 5	114. Nacionalidad COLOMBIA	115. Primer apellido 3	116. Segundo apellido 1	117. Primer nombre 1	118. Otros nombres 6 9
119. Razón social SEINGECOL S.A.S SERVICIO DE INGENIERIA COLOMBIANA	120. Valor capital del socio 289,663,782,473	121. % Participación 3 3	122. Fecha de ingreso 2 0 2 3 1 2 1 5	123. Fecha de retiro			
111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	115. Primer apellido 4	116. Segundo apellido 1	117. Primer nombre 1	118. Otros nombres
119. Razón social	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro			
111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	115. Primer apellido 5	116. Segundo apellido 1	117. Primer nombre 1	118. Otros nombres
119. Razón social	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro			

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 7.711.612

POLO POLANIA

APELLIDOS
WILLIAM ALEXANDER

NOMBRES

FIRMA



INDICE DE PEECHO

FECHA DE NACIMIENTO 26-AGO-1979
NEIVA
(HUILA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.85

ESTATURA

O+

G.S. RH

M

SEXO

19-SEP-1997 NEIVA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARNEL SANCHEZ TORRES



A-1900100-00177863-M-0007711612-20090914

0016037080A 1


6670033354

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO

Yo, WILLIAM ALEXANDER POLO POLANIA identificado con cedula de ciudadanía No. 7.711.612 de Neiva, en mi calidad de Representante Legal del CONSORCIO SAN VICENTE identificado con Nit 901.785.549-8, declaro bajo la gravedad de juramento que el consorcio se encuentra a PAZ Y SALVO en el periodo comprendido desde el primero (01) de marzo de 2024 a la fecha, con las obligaciones sobre el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensiones, Riesgos Laborales y aportes parafiscales en la parte patronal de Cajas de Compensación Familiar.

La presente certificación se expide a solicitud del INTERESADO en Neiva el diez (10) del mes de octubre de dos mil veinticuatro (2024), previa verificación por parte mía de los soportes de pago en seguridad social del consorcio en referencia.

Sin otro particular,



WILLIAM ALEXANDER POLO POLANIA
C.C. 7.711.612 de Neiva
Representante Legal



Nit: 892.002.985-5

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES

Yo, **LUZ ANGELA ROJAS**, identificada con cedula de ciudadanía No. 52.158.483 de Bogotá, y con Tarjeta Profesional No. 66489-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de CONSTRUSAR S.A. identificada con Nit 892.002.985-5, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis meses por los conceptos de pensiones, riesgos profesionales y cajas de compensación familiar

***Nota 1:** Las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios y sujetos pasivos del impuesto sobre la renta para la equidad – CREE, están exonerados del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional de Aprendizaje– SENA y del ICBF y Seguridad Social en Salud, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes, de conformidad con el artículo 7 del Decreto 1828 del 27 de agosto de 2013, reglamentario de la Ley 1607 de 2012.*

Dada en Bogotá, a los cuatro (04) días del mes de octubre del 2024

Atentamente,

LUZ ANGELA ROJAS TAUTIVA
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 66489-T
C.C. No. 52.158.483 de Bogotá

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO


ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002

Yo, **INGRID MARYOLY MEDINA GARCIA**, identificado con cedula de ciudadanía No. 1.069.741.313 de Fusagasugá (Cund.), en mi calidad de Contador de **PROTELCA INGENIEROS ARQUITECTOS SAS** con Nit 830.037.322-8, declaro bajo la gravedad de juramento que la entidad es Contribuyente de Impuesto de Renta y Complementarios, es sujeto pasivo del Impuesto de Renta para la equidad CREE, y a su vez se encuentra a PAZ Y SALVO en el periodo comprendido desde el primero (01) de marzo de 2024 a la fecha, con las obligaciones sobre el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensiones, Riesgos Laborales y aportes parafiscales en la parte patronal de Cajas de Compensación Familiar según lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, lo dispuesto en el artículo 65 de la ley 1819 de 2016 reforma estructural y el artículo 118 de la ley de financiamiento 1943 del 28 de Diciembre de 2018 en concordancia con el artículo 114-1 del E.T. que dice:

Estarán exoneradas del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes

La presente certificación se expide a solicitud del **INTERESADO** en Cajicá el diez (10) del mes de octubre de dos mil veinticuatro (2024), previa verificación por parte mía de los soportes de pago en seguridad social de la empresa en referencia.

Sin otro particular,



INGRID MARYOLY MEDINA GARCIA

Contador

Tarjeta Profesional No. TP 211838-T

C.C. 1.069.741.313 de Fusagasugá (Cund.),

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO


ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002

Yo, **ANGELA ROJAS TAUTIVA**, identificado con cedula de ciudadanía No. 52.158.483 de Bogotá, en mi calidad de Revisor Fiscal de **PROTELCA INGENIEROS ARQUITECTOS SAS** con Nit **830.037.322-8**, declaro bajo la gravedad de juramento que la entidad es Contribuyente de Impuesto de Renta y Complementarios, es sujeto pasivo del Impuesto de Renta para la equidad CREE, y a su vez se encuentra a PAZ Y SALVO en el periodo comprendido desde el primero (01) de marzo de 2024 a la fecha, con las obligaciones sobre el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensiones, Riesgos Laborales y aportes parafiscales en la parte patronal de Cajas de Compensación Familiar según lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, lo dispuesto en el artículo 65 de la ley 1819 de 2016 reforma estructural y el artículo 118 de la ley de financiamiento 1943 del 28 de Diciembre de 2018 en concordancia con el artículo 114-1 del E.T. que dice:

Estarán exoneradas del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes en seguridad social de la empresa en referencia.

La presente certificación se expide a solicitud del INTERESADO en Cajicá el diez (10) del mes de octubre de dos mil veinticuatro (2024), previa verificación por parte mía de los soportes de pago.

Sin otro particular,



LUZ ANGELA ROJAS TAUTIVA
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. TP 66489-T
C.C. 52.158.483 de Bogotá



EL SUSCRITO REVISOR FISCAL

CERTIFICA

Que **SEINGECOL SAS SERVICIO DE INGENIERIA COLOMBIANA NIT. 900072667-5**, ha dado cumplimiento oportuno y completo con los aportes y demás obligaciones legales que le corresponden respecto del Sistema de Seguridad Social cuando a ello ha habido lugar, en cuanto a Salud, Pensiones, Riesgos Profesionales, aportes a Caja de Compensación Familiar.

Dado en Neiva, a los veintiún (21) días del mes de octubre de 2024



HERNANDO QUINTERO MORA

Revisor Fiscal

TP-96943-T


seingecol@gmail.com

km carrera 4-28 3.2 via Palermo Neiva-Hulla


Tel 8716826

 SAN VICENTE GOBIERNO LOCAL		ACTA PARCIAL DE OBRA # 03			
CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA					
CONTRATANTE:	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DE GARZÓN	VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 66.899.134,743.90	ACTA DE INICIO:	20-mar-24
CONTRATO DE OBRA No.	000 DE 2024	VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO:	\$ -	PLAZO:	30 MESES
CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO SAN VICENTE	VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO:	\$ -	FECHA DE TERMINACIÓN:	19-sep-26
CONTRATO DE INTERVENTORIA	001 DE 2024	VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$ 66.899.134,743.90	FECHA DEL ACTA :	SEPTIEMBRE 2024
INTERVENTORIA DE OBRA :	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES	VALOR TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA (Q):	\$ 892.609,683.00	PORCENTAJE EJECUTADO PRESENTE ACTA:	1.82%
SUPERVISOR(A)	MARIA ISABEL MEDINA	VALOR ACUMULADO TOTAL EJECUTADO:	\$ 1,811,313,161.00	PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO:	2.68%
		VALOR TOTAL POR EJECUTAR:	\$ 85,087,471,061.00	PORCENTAJE TOTAL POR EJECUTAR:	97.82%
	VALOR INICIAL DEL CONTRATO:				
ACTA DE RECIBO PARCIAL N°: 03					
PERIODO:SEPTIEMBRE 2024					

ITEM	DESCRIPCION	UNO.	CONDICIONES CONTRACTUALES				PRESENTE PERIODO CORTE # 03				ACUMULADO			
			CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	% ACUM.		
3.2.1	Proceso pilotes D=0.50 m con suministro de agua cerro tanque	M3	283.00	\$ 4,973.363.00	\$ 1,397,894,489.00	121.38	\$ 613,381,094.00	233.56	\$ 1,181,595,572.00	233.56	\$ 1,181,595,572.00	88.81%		
4.2.1	EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN (incluye cargue mecanico y retiro del material excavado a botadero) vial a 9km.	M3	8,736.00	\$ 22,095.00	\$ 193,021,920.00	2,556.95	\$ 56,495,755.00	2,556.95	\$ 56,495,755.00	2,556.95	\$ 56,495,755.00	29.27%		
	TOTAL COSTO DIRECTO OBRA CIVIL				\$ 58,488,344,798.00		\$ 679,977,449.00		\$ 679,977,449.00		\$ 679,977,449.00	2.38%		
	ADMINISTRACION				\$ 12,867,587,856.00		\$ 149,397,039.00		\$ 149,397,039.00		\$ 149,397,039.00	22.00%		
	IMPREVISTOS				\$ 1,754,668,344.00		\$ 20,372,323.00		\$ 20,372,323.00		\$ 20,372,323.00	3.00%		
	UTILIDAD				\$ 2,924,447,240.00		\$ 33,653,872.00		\$ 33,653,872.00		\$ 33,653,872.00	5.00%		
	VALOR TOTAL OBU				\$ 17,546,683,440.00		\$ 203,723,224.00		\$ 203,723,224.00		\$ 203,723,224.00	30.00%		
	TOTAL OBRA				\$ 76,035,628,238.00		\$ 882,609,683.00		\$ 882,609,683.00		\$ 882,609,683.00	2.30%		
	TOTAL OBRA				\$ 76,035,628,238.00		\$ 882,609,683.00		\$ 882,609,683.00		\$ 882,609,683.00	2.30%		
	TOTAL CERTIFICACIONES				\$ 86,733,661,658.00		\$ 892,609,683.00		\$ 892,609,683.00		\$ 892,609,683.00	0.00%		
	AMORTIZACION DE ANTICIPO	30.00%			\$ 26,009,740,423.00		\$ 26,009,740,423.00		\$ 26,009,740,423.00		\$ 26,009,740,423.00	0.00%		
	DESCUENTOS													
	TOTAL PROYECTO				\$ 86,089,134,743.90		\$ 617,068,478.10		\$ 617,068,478.10		\$ 617,068,478.10			





Ing. Argelio Caceres Araujo
 Representante Legal de Interventoría
 CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES






Ing. Valdeir Paul Medina
 Representante Legal Constructor
 CONSORCIO SAN VICENTE


		MEMORIA DE CORTE DE OBRA		Codigo: PA-FO-30 Versión No. 00 Fecha: 5/4/2023	
CONTRATO N°: 090		OBJETO: CONSORCIO SAN VICENTE		CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.B.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARCON-HUILA	
CONTRATISTA: INTERVENTORIA: CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES		CORTE N°: 3		PECHA: SEPTIEMBRE DE 2024	
(a) ITEM N°:	4.1.1	(b) DESCRIPCION ITEM	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (incluye carga mecánico y retiro del material excavado a botadero) viaje a 50m.		(c) UND: m3

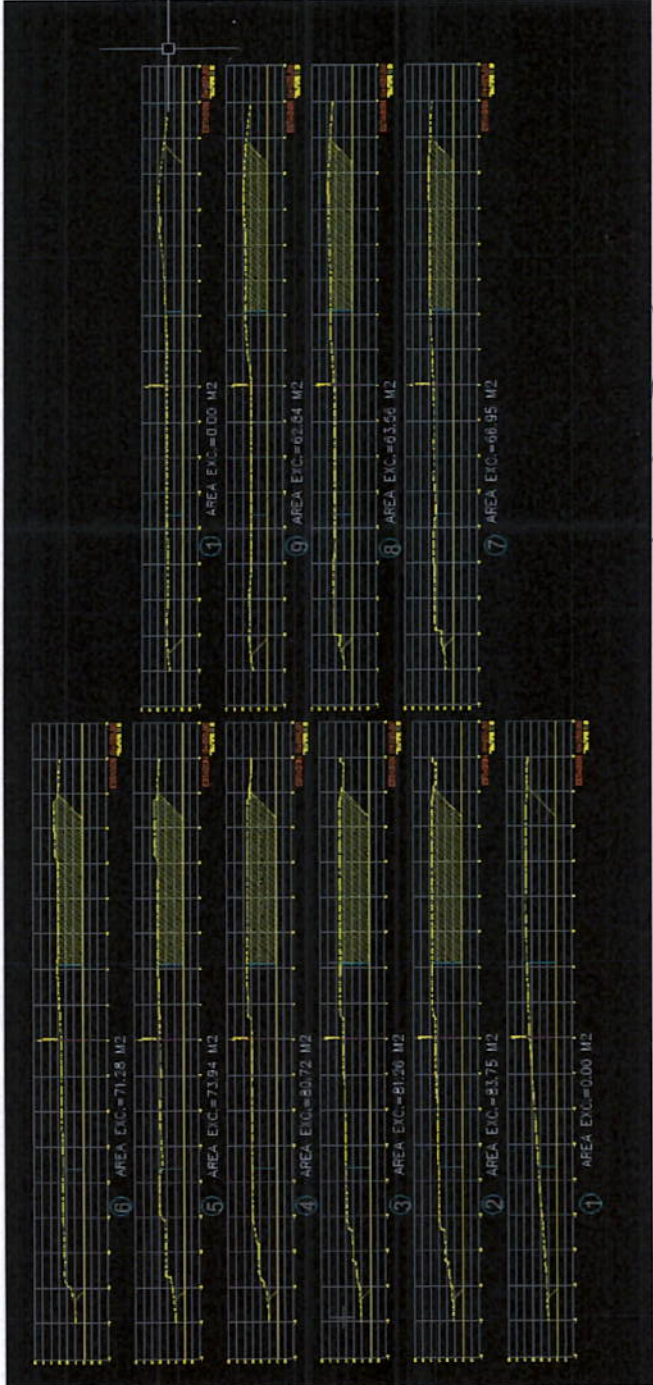


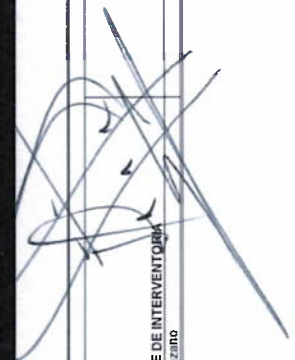Elaboró:	Revisó:
 RESIDENTE DE OBRA Arq. Francisco Barros	 RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq. Jair Lozano

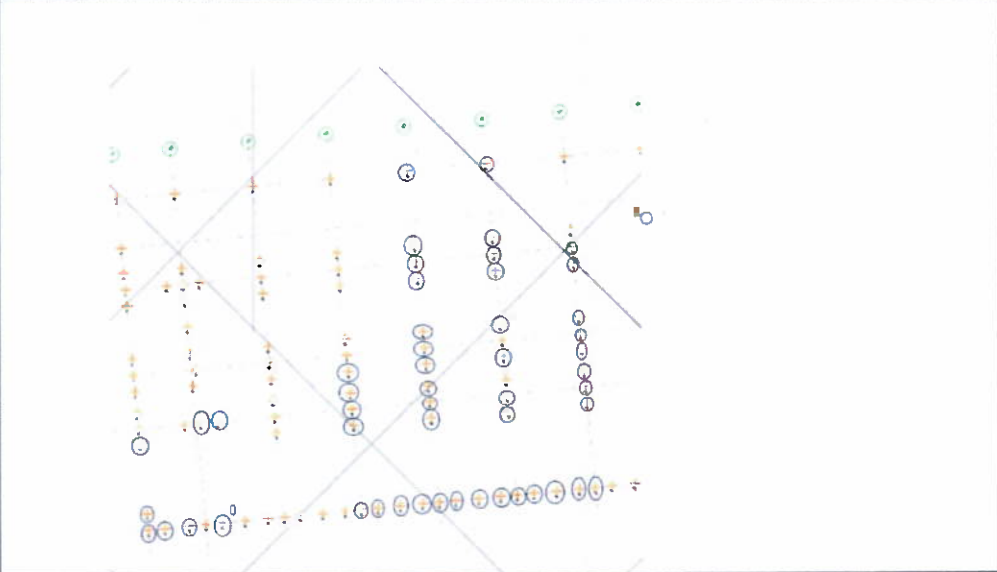		MEMORIA DE CORTE DE OBRA			Codigo: 9A-FO-30 Versión: No. 00 Fecha: 2023		
CONTRATO N°:	060	OBJETO:	CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZON-HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE						
INTERVENIENTE:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	3.2.1	(b) DESCRIPCION ITEM	CORTE N°: 3	FECHA:	SEPTIEMBRE DE 2024		
		Proceso pilotes D=0.50 m con suministro de agua carro tanque					
(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA		(e) LOCALIZACION					
		DIMENSIONES		(i) MEDIDA PARCIAL	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL	
		(f) Ancho	(g) Longitud	AREA (m2)			
		EDIFICIO 7 PISOS LOTE A					
		PILOTES ENTRE EJES 1-6 Y AF					
		47	12.00	0.190			2.35
		19	12.30	0.190			2.41
		20	12.31	0.190			2.41
		52	12.42	0.190			2.43
		50	12.22	0.190			2.40
		51	12.22	0.190			2.40
		17	12.13	0.190			2.38
		11	12.39	0.190			2.42
		60	13.01	0.190			2.55
		14	12.35	0.190			2.42
		13	12.35	0.190			2.42
		49	12.11	0.190			2.37
		63	12.45	0.190			2.44
		70	12.00	0.190			2.35
		61	12.86	0.190			2.52
		62	12.76	0.190			2.50
		12	12.35	0.190			2.42
		16	12.20	0.190			2.39
		66	12.05	0.190			2.36
		64	12.15	0.190			2.38
		72	11.69	0.190			2.29
		48	12.00	0.190			2.35
		71	11.73	0.190			2.30
		73	11.56	0.190			2.27
		65	12.11	0.190			2.37
		67	12.02	0.190			2.36
		68	11.99	0.190			2.35
		75	11.41	0.190			2.24
		76	11.40	0.190			2.23
		77	11.40	0.190			2.23
		69	11.90	0.190			2.33
		78	11.71	0.190			2.30
		99	11.40	0.190			2.23
		98	11.40	0.190			2.23
		100	11.43	0.190			2.24
		81	11.95	0.190			2.34
		83	12.07	0.190			2.37
		97	11.69	0.190			2.29
		74	11.43	0.190			2.24
		79	11.69	0.190			2.30
		91	12.33	0.190			2.42
		96	11.84	0.190			2.32
		90	12.52	0.190			2.41
		92	11.87	0.190			2.33
		95	11.87	0.190			2.33
		84	12.28	0.190			2.41
		82	12.00	0.190			2.35
		15	12.35	0.190			2.42
		85	12.43	0.190			2.44
		93	12.04	0.190			2.36
		94	11.96	0.190			2.34
		115	12.41	0.190			2.43
		86	12.41	0.190			2.43
		TOTAL PAG					125.18
		Elaboró:		Revisó:			
							
		RESIDENTE DE OBRA Arq. Francisco Buitos		RESIDENTE DE INTERVENCIÓN Arq. Jair Lozano			

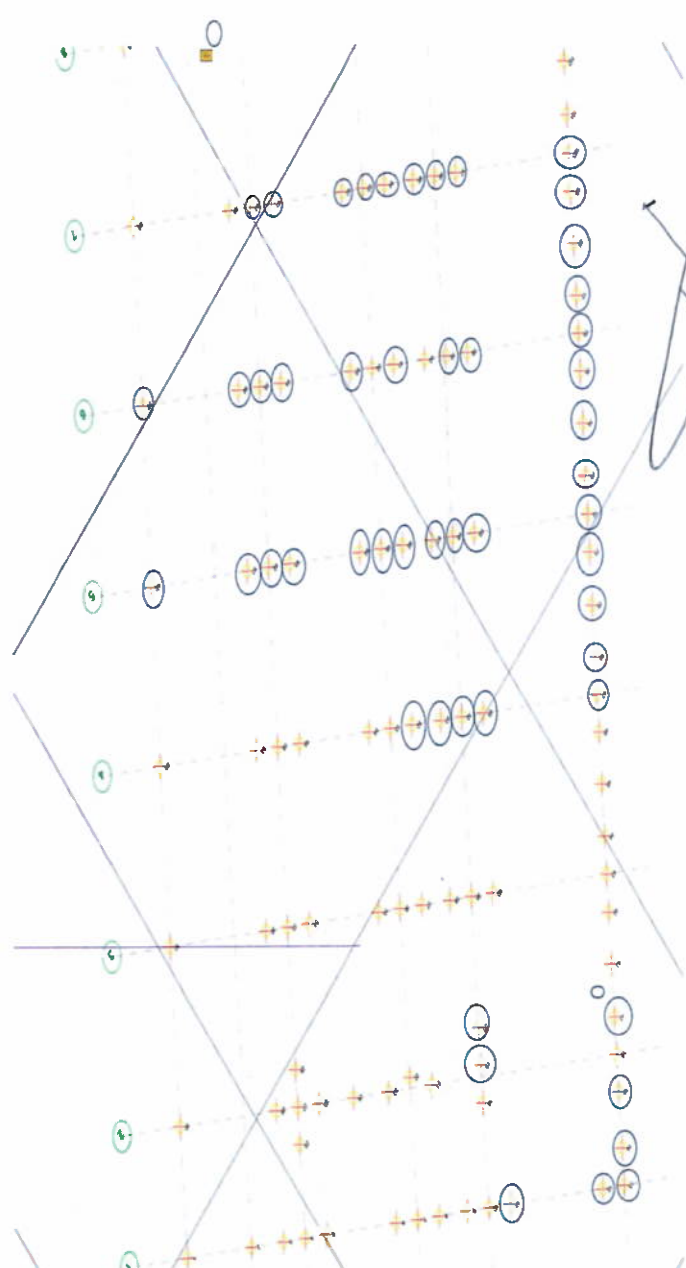		MEMORIA DE CORTE DE OBRA				Código: PA-RO-30 Versión No. 03 Fecha: 5/4/2023	
CONTRATO N°:		OBJETO:		CONTRATISTA:		CONSORCIO SAN VICENTE	
INTERVENITORIA:				CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES			
CORTE N°:		3		FECHA:		SEPTIEMBRE DE 2024	
(a) ITEM N°:		4.1.1		(b) DESCRIPCION ITEM		(c) UND:	
				Proceso pilotes D=40 50 m con suministro de agua cerco tanque		m3	
							
Elaboró:				Revisó:			
RESIDENTE DE OBRA Arg. Francisco Barros				RESIDENTE DE INTERVENITORIA Arg. Jair Lozano			

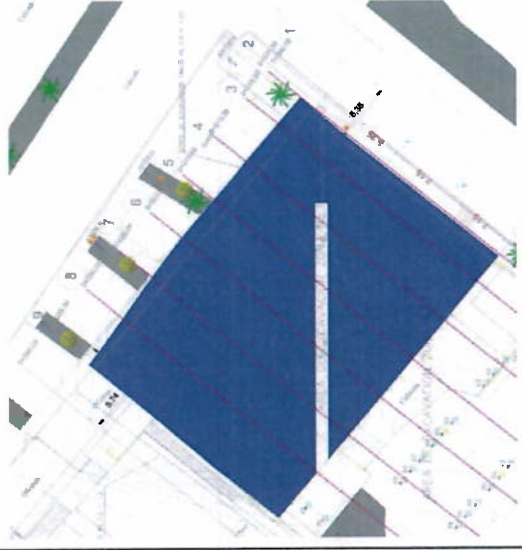		MEMORIA DE CORTE DE OBRA				Código: PA-FO-39 Versión No. 00 Página 1 de 1 2023			
CONTRATO N°:	080	OBJETO:	CONSORCIO SAN VICENTE			CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZON-HUILA			
CONTRATISTA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES			CORTE N°:	3	FECHA:	SEPTIEMBRE DE 2024		
(a) ITEM N°:	4.2.1	(b) DESCRIPCION ITEM	EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN (incluye cague mecanico y retiro del material excavado a boladeto) viaje a 5km.			(c) UND:	m3		
(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA		(e) LOCALIZACION		DIMENSIONES		(f) MEDIDA PARCIAL DE AREA	(g) N° DE ELEMENTOS	(h) MEDIDA TOTAL	
				(f) Ancho	(g) Longitud	AREA (m2)			
		Areas de excavacion tomadas desde borde de talud eje 1 hasta eje 4 entre AF (ver fig área representada color azul)							
		ABSCISA							
		0+000					0	0.00	0.00
		0+001.5					0		
		0+001.5					83.75		
		0+005				3.5	81.26	124.38	288.77
		0+010				5	80.72	121.62	404.95
		0+015				5	73.94	117.69	388.65
		0+020				5	71.28	109.58	363.05
		0+025				5.00	66.95	104.76	345.58
		0+030				5.00	63.56	98.73	326.28
		0+035				5.00	62.84	94.98	316.00
0+039				4.00	0.00	62.84	125.68		
				TOTAL PAG.				2556.95	
Elaboró:		Revisó:							
RESIDENTE DE OBRA Arg Francisco Barrios		RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arg Jair Lozano							

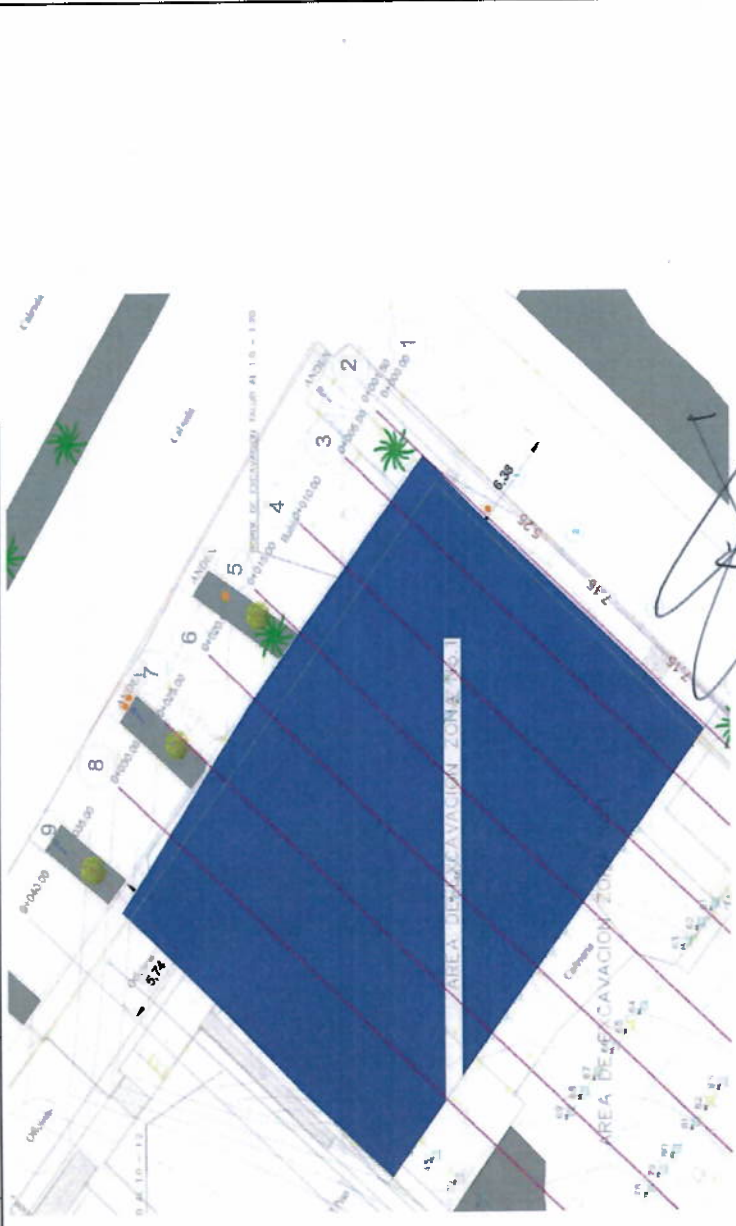 SAN VICENTE GOBIERNO MUNICIPAL		MEMORIA DE CORTE DE OBRA		Código: PA-PO-30 Versión: No. 03 Fecha: 4/2023	
CONTRATO N°: 090 CONTRATISTA: CONSORCIO SAN VICENTE INTERVENTORA: CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES		OBJETO: CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZON-HUILA		Pagina 2 de 4 5/4	
CONTRATO N°: 090 CONTRATISTA: CONSORCIO SAN VICENTE INTERVENTORA: CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES		FECHA: 3/2024		SEPTIEMBRE DE 2024	
(a) ITEM N°: 4.1.1		(b) DESCRIPCION ITEM: 0		(c) UND: m3	
					
Elaboró: 		Revisó: 		RESIDENTE DE OBRA Arqu Francisco Barrios	
RESIDENTE DE OBRA Arqu Francisco Barrios		RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arqu Jair Lozano			



2024SAL00001560

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE
PAÚL GARZÓN - HUILA
NIT: 891.180.026-5

Al contestar, por favor cite estos datos

Radicado:
2024CS001158-1
Fecha: 2024-12-23

RESOLUCIÓN No. 0971 DE 2024
(05 de Diciembre de 2024)

“POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA EL PAGO PARCIAL No. 3 DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 090 DE 2024, SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DE GARZÓN Y CONSORCIO SAN VICENTE”

EL GERENTE DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN, en uso de sus atribuciones legales y en especial las que le confiere la ley 10 del 10 de Enero de 1990, y sus decretos reglamentarios, y

CONSIDERANDO

1. Que el artículo 13 de la Ley 1150 del 2007 determina que, las entidades estatales que por disposición legal cuenten con un régimen contractual excepcional al del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, aplicarán en desarrollo de su actividad contractual, acorde con su régimen legal especial, los principios de la función administrativa y de la gestión fiscal de que tratan los artículos 209 y 267 de la Constitución Política.
2. Que la E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DE GARZÓN, es una entidad pública descentralizada del orden Departamental, dotada de personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, de acuerdo a lo preceptuado en el artículo 194 y siguientes de la Ley 100 de 1993; la cual presta servicios de salud a la población que lo requiera; la cual además se rige en materia de contratación por el derecho privado, pero podrá discrecionalmente, utilizar las cláusulas excepcionales previstas en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública.
3. Que el artículo 4 del Acuerdo No. 016 de 2024 – Estatuto de Contratación de la E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DE GARZÓN, establece que la actividad contractual de la entidad buscará el cumplimiento de los objetivos institucionales y la continua y eficiente prestación de los servicios de salud a su cargo.
4. Que la E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DE GARZÓN procedió a realizar la Convocatoria Pública No.003 del 2023, en virtud de la cual una vez culminado el proceso de selección, suscribió el contrato de obra pública No. 090 el 04 de enero de 2024, con el CONSORCIO SAN VICENTE identificado con Nit 901.785.549-8, cuyo objeto es la “*Construcción de la Nueva E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl del Municipio de Garzón- Huila*”, por valor total de **OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL SETÉCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE Iva Incluido (\$86.899.134.742)**, y con un plazo de ejecución de treinta (30) meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio.



**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE
PAÚL GARZÓN - HUILA**
NIT: 891.180.026-5

2024SAL00001560

5. Que la cláusula quinta del contrato de obra pública No. 090 del 2024, determina como forma de pago que el contratante cancelará al contratista el valor del contrato por el sistema de precios unitarios, mediante actas de recibo parcial de obra, aprobados por el interventor y el supervisor, de acuerdo al avance de obra y el suministro de equipos hasta el noventa y cinco por ciento 95% previa amortización del anticipo en igual proporción al porcentaje pagado.
6. Que adicionalmente, el párrafo primero de la cláusula quinta del contrato de obra pública, reseña que para efectos de los pagos, el contratista debe acreditar el cumplimiento de sus obligaciones con el sistema de seguridad social; y el párrafo segundo de la misma, establece que para los mismos efectos, aquel deberá aportar un informe firmado por el interventor que contenga el valor del contrato ejecutado y pendiente por ejecutar, sustentando con memorias de cantidades de obras detalladas con los respectivos esquemas y planos de ubicación, aprobados por la interventoría y la supervisión; porcentaje de ejecución física a la fecha; informe de ejecución, avance y estado de la obra con registro fotográfico; el plazo del contrato y el faltante por ejecutar; adicionales en valor y plazo; suspensiones del contrato; vigencias de las garantías de contrato; constancia de encontrarse a paz y salvo con los pagos al sistema de seguridad social y parafiscales; cumplimiento de las obligaciones del contrato; la descripción, cantidad y costos de los imprevistos que se causaron durante el periodo de obra; equipos y personal utilizado durante el periodo de la obra; el valor a pagar con el acta de recibo parcial del contrato de obra (con su respectivo informe de avance).
7. Que el párrafo cuarto de la cláusula quinta del contrato de obra pública, consagra que los valores a pagar se efectuarán tomando como base el avance de las obras, certificado por el interventor y el supervisor, cuyo valor corresponderá al resultado multiplicar las cantidades de obra realmente ejecutadas a la fecha de corte, por los precios unitarios pactados.
8. Que el contratista CONSORCIO SAN VICENTE, identificado con NIT 901.785.549-8, presentó cuenta de cobro a la E.S.E. Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón por el anticipo correspondiente al 30% del valor del Contrato de Obra No. 090 de 2024, trámite que fue avalado por la interventoría mediante el Oficio ICHDSV-27-2024 y certificado por el Supervisor del Contrato el 9 de abril de 2024, quien verificó que se cumplió con la documentación requerida, incluyendo el visto bueno del Profesional Universitario Almacén; en consecuencia, el pago del anticipo fue girado el 18 de abril de 2024.
9. Que el CONSORCIO SAN VICENTE con Nit 901.785.549-8 presentó factura N° CSV 2 Y el ACTA PARCIAL DE OBRA No. 001 a la E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DE GARZÓN por valor de DOSCIENTOS OCHO MILLONES NOVECIENTOS CINCO MIL SETECIENTOS DOCE PESOS CON SESENTA CENTAVOS M/CTE (\$208.905.712,60) correspondiente a un pago parcial del Contrato de Obra No. 090 de 2024. De dicho valor, se descontó el 30% para la amortización del anticipo, según lo establecido en la cláusula quinta del contrato, resultando un total neto a pagar de CIENTO CUARENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS (\$146.233.999). Este pago fue avalado y aprobado por la interventoría, contando con el visto bueno del supervisor



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE
PAÚL GARZÓN - HUILA
NIT: 891.180.026-5

2024SAL00001560

y el apoyo técnico a la supervisión, y autorizado mediante la Resolución 0868 del 17 de octubre de 2024.

10. Que luego, el CONSORCIO SAN VICENTE con Nit 901.785.549-8 presentó factura No. CSV 3 y el ACTA PARCIAL DE OBRA N°002 a la E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DE GARZÓN por valor de SETECIENTOS DIECINUEVE MILLONES SEISCIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON CUARENTA CENTAVOS M/CTE (\$719.606.482,40) correspondiente a un pago parcial del Contrato de Obra No. 090 de 2024. De dicho valor, se descontó el 30% para la amortización del anticipo, según lo establecido en la cláusula quinta del contrato, resultando un total neto a pagar de QUINIENTOS TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTIUN MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON CUARENTA CENTAVOS M/CTE(\$503.721.537,40) Este pago fue avalado y aprobado por la interventoría, contando con el visto bueno del supervisor y el apoyo técnico a la supervisión, y autorizado mediante la Resolución 0916 del 08 de Noviembre de 2024.
11. Que el CONSORCIO SAN VICENTE identificado con Nit 901.785.549-8, junto con el interventor de la obra CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES, el apoyo técnico a la supervisión HARCOL INGENIERIA S.A.S y la supervisora, suscribieron el **ACTA PARCIAL DE OBRA NO. 003** de fecha 30 de Septiembre del 2024, la cual comprende el periodo del 01 al 30 de septiembre del 2024, conforme a lo establecido en la cláusula quinta del contrato de obra pública No. 090 del 2024.
12. Que en consecuencia, el CONSORCIO SAN VICENTE mediante factura electrónica de venta No. CSV6 de fecha 5 de diciembre del 2024, facturó por concepto del contrato de obra pública No. 090 del 2024, la suma de **OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS CON SETENTA CENTAVOS M/CTE (\$882.800.683,70).**
13. Que una vez cumplidos los requisitos antes expuestos por parte del contratista y conforme al **ACTA PARCIAL DE OBRA NO. 003** de fecha 30 de Septiembre del 2024, la Entidad autoriza el pago por concepto de pago parcial del contrato de obra pública No. 090 del 2024, por la suma de OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE (\$882.800.683,00) de los cuales se descontara el 30% para amortización del anticipo de acuerdo a la cláusula quinta del mismo, para un total de **SEISCIENTOS DIECISIETE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE(\$617.960.479).**

14. Que en mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO Reconocer a favor del **CONSORCIO SAN VICENTE** identificado con NIT 901.785.549-8, la suma de **SEISCIENTOS DIECISIETE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE (\$617.960.479)**, en calidad de pago parcial No. 3 del contrato



2024SAL00001560

**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE
PAÚL GARZÓN - HUILA**
NIT: 891.180.026-5

de obra pública No. 090 de 2024, menos retenciones de ley.

PARÁGRAFO:

Hace parte integral del presente acto administrativo: El Acta parcial de obra No. 03 de fecha 30 de septiembre del 2024, y la factura electrónica de venta No. CSV6 del 05 de diciembre del 2024.

ARTÍCULO SEGUNDO: Autorizar a la Pagadora de la E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DE GARZÓN, para que con cargo a los recursos del Sistema General de Regalías, a través del medio o herramienta de pago dispuesto por el SGR, pague y transfiera el reconocimiento hecho en el artículo anterior, a la cuenta corriente No. 267877108 del banco de Occidente de propiedad del CONSORCIO SAN VICENTE NIT 901.785.549-8.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Garzón (Huila) a los cinco (05) días del mes de Diciembre de dos mil veinticuatro (2024).

CARLOS DANIEL MAZÁBEL CÓRDOBA
Gerente

Proyectó: Luis Fernando Castro Maje



Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHIalarcon

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-410003

Fecha y Hora Sistema: 2025-01-14-4:21 p. m.

LAURA PIEDAD ALARCON CULMA

ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL

RELACION DE PAGOS					
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	901785549	Tercero:	
DOCUMENTO SOPORTE					
Tipo:	CONTRATO	Número:	090 DE 2024	Fecha:	2024-01-04
OBJETO					
Objeto:	CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.SE. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZON HUILA				
Unidad / Sub-Unidad:	03-410003 ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL			Número de Compromiso:	224

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	TIPO	NUMERO	CODIGO
2024-11-15	1024	146.233.999,00		1124		186834924	2024-11-21	146.233.999,00	18.801.515,00	127.432.484,00	267877108	BANCO DE OCCIDENTE			01-130100-DT
2024-12-03	1224	503.724.538,00		1324		189121724	2024-12-23	503.724.538,00	64.764.583,00	438.959.955,00	267877108	BANCO DE OCCIDENTE			01-130100-DT
2024-12-20	1524	617.960.480,00		1624		189517824	2024-12-27	617.960.480,00	79.452.061,00	538.508.419,00	267877108	BANCO DE OCCIDENTE			01-130100-DT
2024-12-23	1624	273.438.521,00		1724		189520324	2024-12-27	273.438.521,00	35.156.381,00	238.282.140,00	267877108	BANCO DE OCCIDENTE			01-130100-DT

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente menciondas

