



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE
PAÚL GARZÓN - HUILA
NIT: 891.180.026-5

ACTA PARCIAL DE OBRA

1. DESCRIPCION GENERAL				
CLASE DE ACTA:	FINAL: _____ PARCIAL: <u>X</u> No.: <u>04</u>			
CONTRATO DE:	OBRA	Nº:	090	AÑO: 2024
CONTRATANTE:	E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DE GARZÓN			
CONTRATISTA O CONVINIENTE:	NOMBRE O RAZON SOCIAL:	CONSORCIO SAN VICENTE		
	NIT O CC:	901.785.549-8		
	DIRECCIÓN:	CR 4 2 85 ZN INDUSTRIAL KM 3 VIA PALERMO	TEL.	8716826
	CIUDAD:	PALERMO - HUILA		
	REPRESENTANTE LEGAL:	WILLIAM ALEXANDER POLO POLANIA		
	CC:	7.711.612 de Neiva-Huila		
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA			
REGISTRO PRESUPUESTAL:	SPGR No 224 RP No 557 - E.S.E HOSPITAL DPTAL SAN VICENTE			
CUENTA BANCARIA	Nº: 267877108 Tipo de Cuenta: CORRIENTE Banco: BANCO DE OCCIDENTE			
VALOR INICIAL (CONTRATISTA):	\$ 86.899.134.742			
	Valor en Letras: OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/Cte.			
VALOR ADICIONAL	Nº2	N.A.		
VALOR TOTAL	OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/Cte. (\$ 86.899.134.742)			
PLAZO INICIAL:	TREINTA (30) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO.			
PLAZO ADICIONAL:	Nº1	N.A.		
PLAZO TOTAL:	TREINTA (30) MESES			
FECHA DE INICIO:	20 DE MARZO DE 2024			
FECHA DE SUSPENSIÓN Y REINICIACIÓN:	N.A.			
FECHA DE TERMINACION:	19 DE SEPTIEMBRE DE 2026			

Calle 7 No. 14-69 PBX (098) 8332441 Ext: 256 Fax (098) 8333225 Gerencia (098) 8332570
web: hospital-departamental-san-vicente-de-paul-garzon-huila.micolombiadigital.gov.co - Email:
calidad@hospitalsvpgarzon.gov.co, gerencia@hospitalsvpgarzon.gov.co
Garzón (Huila).

JOHN EDGAR HOOVER

JOHN EDGAR HOOVER, Special Agent in Charge, Bureau of Investigation, United States Department of Justice, Washington, D. C.

JOHN EDGAR HOOVER, Special Agent in Charge, Bureau of Investigation, United States Department of Justice, Washington, D. C.

JOHN EDGAR HOOVER, Special Agent in Charge, Bureau of Investigation, United States Department of Justice, Washington, D. C.

JOHN EDGAR HOOVER, Special Agent in Charge, Bureau of Investigation, United States Department of Justice, Washington, D. C.

JOHN EDGAR HOOVER, Special Agent in Charge, Bureau of Investigation, United States Department of Justice, Washington, D. C.

JOHN EDGAR HOOVER, Special Agent in Charge, Bureau of Investigation, United States Department of Justice, Washington, D. C.

JOHN EDGAR HOOVER, Special Agent in Charge, Bureau of Investigation, United States Department of Justice, Washington, D. C.

JOHN EDGAR HOOVER, Special Agent in Charge, Bureau of Investigation, United States Department of Justice, Washington, D. C.

JOHN EDGAR HOOVER, Special Agent in Charge, Bureau of Investigation, United States Department of Justice, Washington, D. C.

JOHN EDGAR HOOVER, Special Agent in Charge, Bureau of Investigation, United States Department of Justice, Washington, D. C.

JOHN EDGAR HOOVER, Special Agent in Charge, Bureau of Investigation, United States Department of Justice, Washington, D. C.

JOHN EDGAR HOOVER, Special Agent in Charge, Bureau of Investigation, United States Department of Justice, Washington, D. C.

JOHN EDGAR HOOVER, Special Agent in Charge, Bureau of Investigation, United States Department of Justice, Washington, D. C.

JOHN EDGAR HOOVER, Special Agent in Charge, Bureau of Investigation, United States Department of Justice, Washington, D. C.



**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE
PAÚL GARZÓN - HUILA**
NIT: 891.180.026-5

FECHA DE LA PRESENTE ACTA:	31 DE OCTUBRE DE 2024	
PERIODO QUE COMPRENDE LA PRESENTE ACTA:	01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024 ✓	
PRESENTES HOY:	NOMBRE:	WILLIAM ALEXANDER POLO POLANIA
	EN CALIDAD DE:	R.L CONSORCIO SAN VICENTE
	NOMBRE:	ARGELIO CERQUERA ARAUJO
	EN CALIDAD DE:	R.L CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES
	NOMBRE:	MARIA ISABEL MEDINA
	EN CALIDAD DE:	SUPERVISIÓN DEL CONTRATO

2. ANEXO FINANCIERO	
GENERALIDADES DEL CONTRATO	
Numero de contrato	090 de 2024 ✓
Contratista	CONSORCIO SAN VICENTE
Nit contratista	901785549-8 ✓
Objeto del contrato	CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 090 DE 2024 SUSCRITO ENTRE LA E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DE GARZON - HUILA Y EL CONSORCIO SAN VICENTE
Fecha de suscripción del contrato	ENERO 4 DE 2024
Plazo de ejecución del contrato	30 meses
Fecha de inicio del contrato	MARZO 20 DE 2024
Valor del contrato	\$ 86,899,134,742.00 ✓
Interventor	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES ✓
SITUACION FINANCIERA DEL CONTRATO	
Valor total del contrato	\$ 86,899,134,742.00 ✓
Valor pagado en calidad de anticipo o pago anticipado	\$ 26,069,740,422.00 ✓
Valor pagado o causado a la fecha acta #1	\$ 208,905,712.00 ✓
Valor pagado o causado a la fecha acta #2	\$ 719,606,764.00 ✓
Valor pagado o causado a la fecha acta #3	\$ 882,800,683.00 ✓
Valor acta periodo certificado	\$ 390,626,459.00 ✓
Amortización del anticipo	\$ 117,187,937.70 ✓
Valor final acta periodo certificado	\$ 273,438,521.30 ✓
Retención de garantía 10%	\$ 39,062,645.90 ✓
valor neto a pagar	\$ 234,375,875.40 ✓
Saldo por ejecutar del contrato	\$ 59,288,036,587.40 ✓



3. CUMPLIMIENTO (PAGOS A SALUD, PENSIÓN, RIESGOS Y PARAFISCALES)

Que el CONSORCIO SAN VICENTE contratista, se encuentra al día en el pago de los aportes en salud, pensión y ARL, según las planillas de octubre de 2024 para constancia adjunto al presente documento se entregan certificados de cumplimiento de aportes.

PLANILLA No 9477317918 APORTES EN LINEA – CONSORCIO SAN VICENTE


Total, Planilla mes octubre 2024	Salud	12,5%	\$ 2.854.700
	Pensión	16 %	\$ 11.298.600
	ARL	6.96%	\$ 4.919.300
Total \$ 21.931.500	CCF		\$ 2.858.900

4. RECIBO A SATISFACCIÓN (POR PARTE DE LA INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN)

1. El contrato arriba descrito se viene desarrollando de conformidad con lo pactado en el mismo, en el cual se efectuaron las actividades objeto del contrato.
2. Que en ejecución del contrato se autorizan el siguiente pago: **Acta Parcial No. 4** por un valor de **\$390,626,459.00** sin amortizar anticipo, el valor amortizar del anticipo es de **\$117,187,937.70** Una vez amortizado el anticipo el valor neto a pagar es de **DOCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VENTIUN PESOS CON TREINTA CENTAVOS M/CTE. (\$273,438,521.30)** ✓
3. Que las partes contratantes se encuentran cumpliendo con lo pactado, por lo que de común acuerdo imparten la aprobación a la presente acta parcial No 04.


MARIA ISABEL MEDINA OSORIO
SUPERVISORA


JOAN ERNESTO PALACIOS YUNDA
R.L HARCOL INGENIERIA S.A.S
APOYO TECNICO A LA SUPERVISIÓN


WILLIAM ALEXANDER POLO POLANIA
R.L CONSORCIO SAN VICENTE
CONTRATISTA


ARGELIO CERQUERA ARAUJO
R.L CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES
INTERVENTORIA



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE
PAÚL GARZÓN - HUILA
NIT: 891.180.026-5

**LA SUSCRITA SUPERVISORA DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA EN LA MODALIDAD
DE INTERVENTORIA No.091 DE 2024**

CERTIFICA

Que recibimos del CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES identificado con Nit. No. 901.785.559-1, el Acta Parcial de Obra #3 que corresponde a la obra ejecutada del 1 al 30 de septiembre de 2024 por el CONSORCIO SAN VICENTE identificado con Nit. No.901.785.549-8, por valor de OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS (\$882.800.683.00) M/CTE.

Que se de conformidad con las memorias de cálculo y los documentos soporte, presentados y debidamente aprobados por Interventoría, se da viabilidad para que la E.SE. proceda a realizar el pago correspondiente del ACTA PARCIAL DE OBRA #3 del Contrato de Obra Pública No.090 de 2024.

Que la medición de cantidades de los ítems incluidos y el seguimiento tanto de obra como de calidad de materiales y ensayos de laboratorios son responsabilidad del interventor y el contratista de obra, de conformidad con sus compromisos contractuales.

Atentamente,



MARIA ISABEL MEDINA OSORIO

Supervisora

E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL
GARZÓN – HUILA

Proyectó y revisó:


JOAN ERNESTO PALACIOS YUNDA
R.L. HARCOL INGENIERÍA S.A.S
Apoyo a la Supervisión



1

2


3

4

5

6

CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES



CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES EN CALIDAD DE INTERVENTOR

CERTIFICA:


Que el **CONSORCIO SAN VICENTE**, identificado con Nit. No. 901.785.549-8, cumplió a satisfacción con el objeto, obligaciones y plazo de ejecución consignados en el Contrato de Obra Pública No. 090 de 2024, cuyo objeto consiste en: **"CONSTRUCCIÓN DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE GARZÓN - HUILA"**.

Que, de igual forma el contratista ha acreditado y aportado el pago de los aportes a la seguridad social Integral y parafiscal en los montos y plazos establecidos verificando el cumplimiento conforme a lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

En razón a ello, autorizo el pago conforme al siguiente detalle:

No. de Pago:	Corte Parcial de Obra No. 04
Periodo o Mes:	01 Octubre de 2024 – 31 Octubre de 2024
Valor a Cancelar:	\$ 390.626.459,00 PESOS MCTE (TRESCIENTOS NOVENTA MILLONES SEISCIENTOS VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/CTE) ✓

Se expide en el Municipio de Garzón - Huila, a los 31 días del mes de octubre de 2024.


Nombre: Ing. ARGELIO CERQUERA ARAUJO
Cargo: REPRESENTANTE LEGAL

Elaboró: Edger Solórzano Medina / Director de Interventoría

ANEXOS			
• Informe de actividades	X	• Soporte magnético	
• Soportes pago de Seguridad Social y Parafiscales	X	• Entrada de Almacén	
Persona natural: Planilla y recibo de caja.		• Factura Comercial	X
Persona Jurídica: Certificación Representante Legal o Revisor Fiscal	X		



CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES

CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES EN CALIDAD DE INTERVENIENTOS

CERTIFICADO

Que el CONSORCIO SAN VICENTE, identificado con NIT No. 407.745.848, cumplió a satisfacción con el contrato de construcción y mantenimiento de la obra de construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales de la ciudad de Bogotá, D.C., en el término de 180 días hábiles, de acuerdo con lo establecido en el contrato de obra No. 001 de 1998, suscrito entre el Consorcio Interconstructores y la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C.

Que el Consorcio Interconstructores, en su calidad de Interventor, ha verificado y certificado que la obra de construcción y mantenimiento de la planta de tratamiento de aguas residuales de la ciudad de Bogotá, D.C., ha sido ejecutada de acuerdo con lo establecido en el contrato de obra No. 001 de 1998, suscrito entre el Consorcio Interconstructores y la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C.

En consecuencia, el Consorcio Interconstructores, en su calidad de Interventor, certifica que la obra de construcción y mantenimiento de la planta de tratamiento de aguas residuales de la ciudad de Bogotá, D.C., ha sido ejecutada de acuerdo con lo establecido en el contrato de obra No. 001 de 1998, suscrito entre el Consorcio Interconstructores y la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C.

En Bogotá, D.C., a los 15 días del mes de mayo del año 2000, el suscrito, **JOSE ANTONIO GONZALEZ GONZALEZ**, Interventor del Consorcio Interconstructores, en su calidad de Interventor, ha verificado y certificado que la obra de construcción y mantenimiento de la planta de tratamiento de aguas residuales de la ciudad de Bogotá, D.C., ha sido ejecutada de acuerdo con lo establecido en el contrato de obra No. 001 de 1998, suscrito entre el Consorcio Interconstructores y la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C.

Se extiende el presente certificado en dos ejemplares, uno de los cuales se conserva en el expediente de la obra y el otro se entrega al Consorcio Interconstructores, en su calidad de Interventor.

Firmado por: **JOSE ANTONIO GONZALEZ GONZALEZ**
Interventor del Consorcio Interconstructores

En Bogotá, D.C., a los 15 días del mes de mayo del año 2000, el suscrito, **JOSE ANTONIO GONZALEZ GONZALEZ**, Interventor del Consorcio Interconstructores, en su calidad de Interventor, ha verificado y certificado que la obra de construcción y mantenimiento de la planta de tratamiento de aguas residuales de la ciudad de Bogotá, D.C., ha sido ejecutada de acuerdo con lo establecido en el contrato de obra No. 001 de 1998, suscrito entre el Consorcio Interconstructores y la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C.



CONSORCIO SAN VICENTE
NIT 901.785.549-8
CR 4 2 85 ZN INDUSTRIAL KM 3 2 VIA
PALERMO
Tel: (608) 716826
Neiva - Colombia
consorciosanvicente2024@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. CSV 5

Señores	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTMENTAL SAN VICENTE DE PAUL GARZON - HUILA		
NIT	891.180.026-5	Teléfono	(608) 8332441 - Ext. 000
Dirección	Calle 7 14-69	Ciudad	Garzón - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	05/12/2024, 09:56
Expedición	05/12/2024, 10:05
Vencimiento	05/12/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA ESE HOSPITAL DEPARTMENTAL SAN VICENTE DE	1.00	300,481,891.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológicos: Siigo SAS - Nit 830.046.145-8, Nombre Software: Siigo Hubo, Firma electrónica: ver en el XML

Total items: 1

Valor en Letras:

Trescientos noventa millones seiscientos veintiseis mil cuatrocientos cincuenta y ocho pesos m/cte con treinta cent.

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Instrumento de pago no definido - Cruce de \$ 117,187,937.00
vencimiento - Cuota No. CC-3-1 vence el 2024-06-17 por
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-12-05 \$ 273,438,521.30
por

Observaciones:

AMORTIZACION ANTICIPO 30% : \$ 117.187.937
CORTE PARCIAL DE OBRA No 4 "CONSTRUCCION DE LA
NUEVA E.S.E HOSPITAL DEPARTMENTAL SAN VICENTE DE
PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZON - HUILA"

Total Bruto	300,481,891.00
Administración 22.00%	66,106,016.02
Imprevistos 3.00%	9,014,456.73
Utilidad 5.00%	15,024,094.55
Total a Pagar	390,626,458.30

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor, Número Autorización Electrónica 18764070848973 aprobado en 20240516 prefijo CSV desde el número 1 al 500 Vigencia: 24 Meses

No responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa
CUFE: 982d53be7444a060bad49c603bd234e622f9a073f0c35fc1740546b144e73a3718a78b9cf01272b0c550489c930313






**REVISIÓN, VERIFICACIÓN, MODIFICACIÓN
Y APROBACIÓN DE DOCUMENTOS**

**“CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E HOSPITAL DEPARTAMNETAL SAN
VICENTE DE PAUL DEL MUNUICIO DE GARZON-HUILA”**

CONTROL DE REVISIÓN

VERSIÓN No.	No. PAGINAS	FECHA	REVISO	APROBÓ	DESCRIPCIÓN DE LA REVISIÓN
00	17	agosto	Ing. Zaida Carine Aljure Naranjo		Informe de gestión octubre de 2024

1. Tabla de contenido

1. INTRODUCCIÓN	4
2. INFORMACION FINANCIERA	5
3. DESCRPCION DE ACTIVIDADES PRESENTE PERIODO	6
4. Certificados y resultados de laboratorio.....	16
5. ASPECTOS RELEVANTES EN EL PRESENTE PERIODO	16
6. CONCLUSIONES.....	17


1. INTRODUCCIÓN

Bajo el contrato de obra pública N° 090 de 2024 “**CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZON-HUILA** “. Nos permitimos describir las obras a ejecutar en el proyecto en referencia

Localización del proyecto.

DIRECCIÓN: CALLE 7 N°14-69

MUNICIPIO: Garzón departamento del Huila

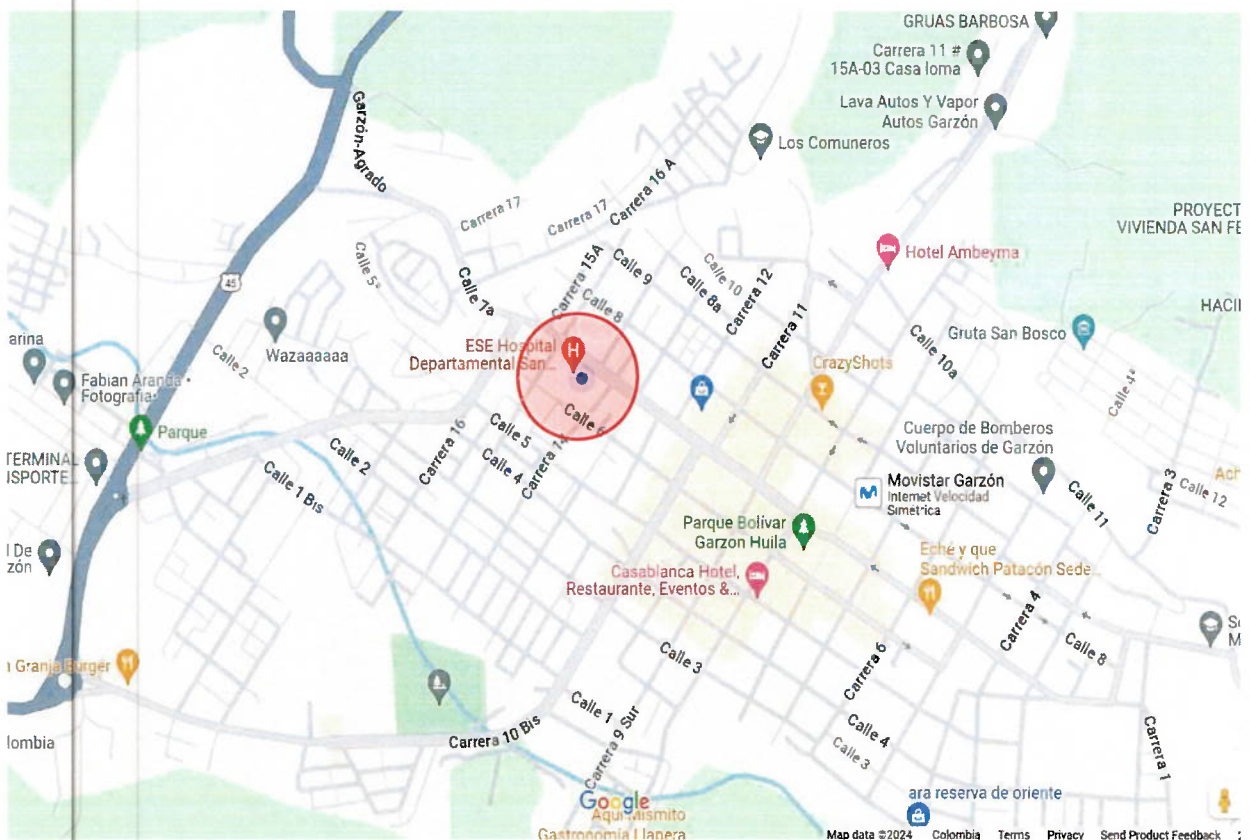

2. INFORMACION FINANCIERA

2.1 ESTADO DEL CONTRATO DE OBRA

Numero de contrato	090 DE 2024
Fecha de suscripción	04/01/2024
Organización contratante	E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL GARZON HUILA
Proyecto	E.S.E HOSPITAL SAN VICENTE D EPAUL
Objeto del contrato	<i>"CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E HOSPITAL DEPARTAMNETAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNUICIO DE GARZON-HUILA"</i>
Domicilio contractual	CR 4 No 2-85 Zona Industrial vía palmero
Contratista de obra	CONSORCIO SAN VICENTE
Nit. del contratista de obra	901.785.549-8
Representante legal	WILLAM ALEXANDER POLO POLANIA
CC. del representante legal	7.711.612
Director de obra	ZAIDA CARINE ALJURE NARANJO
Valor del contrato	\$ 86.899.134.742
Plazo de ejecución	30 MESES
Fecha de inicio	20/03/2024
Fecha de Suspensión	N. A
Fecha de Terminación	19/09/2026
Prorroga	N. A
Fecha de reinicio	N. A
Fecha de terminación	N. A

3. DESCRPCION DE ACTIVIDADES PRESENTE PERIODO

En el presente periodo se realizaron actividades en el área del lote A Y B, lote B corresponde a las áreas técnicas dispuestas para sub estación eléctrica y otros servicios, y actividades en lote A, área dispuesta para el edificio asistencial

Edificios técnicos Lote B


Las actividades de construcción para el edificio técnico de sub estación eléctrica ubicado en el lote B Para el presente periodo se enfocó en la instalación de infraestructura necesaria para el avance de la obra civil. Actividades que se centraron en armado de aceros de refuerzo y vaciado de concreto para elementos estructurales

Vaciado de concreto para columnas: considerando que el amarre de barras de acero para columnas se encontraba completo, recibido y revisado por parte de la firma interventora, se procedió al encofrado y con el vaciado de concreto. El concreto vaciado de concreto para columnas corresponde a concreto de 4000 psi según especificaciones técnicas del proyecto, debidamente vibrado para evitar burbujas de aire y obtener una mayor densidad y resistencia.

- Armado de cama para placa: En esta etapa, se colocó la cama base con formaleta sten, a fin de soportar los aceros de refuerzo estructural que componen la placa de cubierta del edificio 2, asegurando su alineación y nivelada. Esta cama servirá como el refuerzo inferior para la placa, proporcionando soporte para el concreto que se vaciará posteriormente.
- Armado de aceros para vigas de la placa de cubierta: Se procede con el armado de los aceros de las vigas que soportarán la placa de cubierta. Esta actividad se realiza apoyados en los planos estructurales a fin de asegurar que cada barra esté en su posición y amarrada de acuerdo con los planos estructurales. Se usan estribos y amarres que den estabilidad a las vigas durante el vaciado de concreto.
- Vaciado de concreto en vigas y placa de cubierta: Finalmente, una vez armado el acero, se realiza el vaciado de concreto en las vigas y en la placa de cubierta. El concreto empleado corresponde a concreto de 4000 psi según lo establecido en las especificaciones técnicas Al igual que en las columnas, se realiza su respectivo vibrado adecuadamente y se controla su fraguado para garantizar la estabilidad y durabilidad de la estructura.

Las actividades desarrolladas contaron con la supervisión y aval para ejecución por parte de la firma interventora, para asegurar el cumplimiento de las normas de calidad y seguridad. Estos aspectos son fundamentales en la construcción de subestaciones eléctricas, ya que los elementos estructurales deben soportar grandes cargas y vibraciones, además de cumplir con estrictos estándares de ingeniería y seguridad eléctrica.

ENCOFRADO Y VACIADO DE COLUMNAS EDIFICIO 2

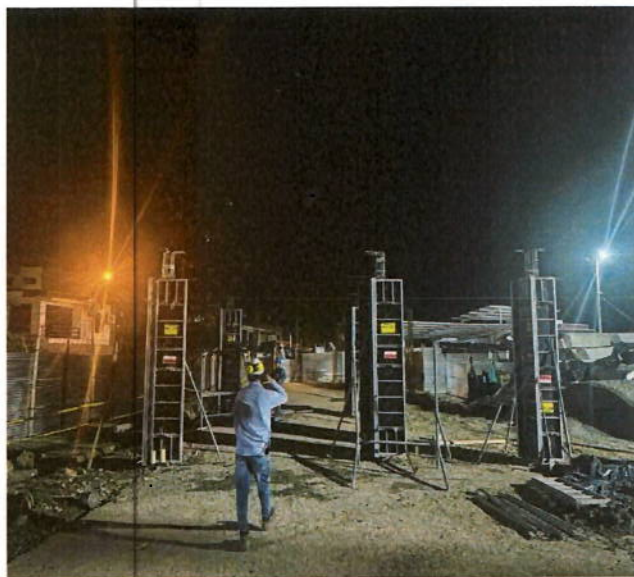

ARMADO DE CAMA PARA PLACA DE CUBIERTA Y ARMADO DE ACEROS DE REFUERZO PARA VIGAS EDIFICIO 2



INSTALACION DE CASETON EN ICOPOR DE ALTA DENSIDAD



VACIADO DE CONCRETO PLACA DE CUBIERTA EDIFICO TECNICO 2





EDIFICIO ASITENCIAL LOTE A

En este frente de obra se llevó a cabo ejecución de obra concerniente con actividades de pilotaje las cuales se desarrollan entre ejes 6 y 10 y ejes AF, excavaciones para sótano, excavaciones de vigas de cimentación placa de contrapiso sótano, armado de acero para vigas de cimentación

- Proceso de pilotaje: Se llevo a acabo el desarrollo de actividades en las áreas designadas, para el presente periodo se realizó la excavación, amarre de acero para pilotes y vaciado de concreto de 52 pilotes ubicados entre los ejes 6 y 10 entre ejes AF

Con el vaciado de concreto del os 52 elementos en el presente periodo se dieron por culminada la actividad pilotaje, completando los 149 pilotes estimados para el proyecto.

- Excavación para sótano y vigas de cimentación : Se continuo con las actividades de excavación con maquinaria mecánica cumpliendo con los niveles estimados e indicados en los planos estructurales , en las paredes del talud que conforma la excavación se implementó pañete sobre el mismo según especificaciones técnicas a fin de evitar desprendimientos y asegurar la estabilidad de la obra , de igual forma garantizar la seguridad del personal operativo , la disposición del material de excavación se realizó de acuerdo a lo estipulado y dispuesto en el sitio autorizado
- Armado de acero para vigas: Se realizó el armado de acero de refuerzo para las vigas de cimentación, cumpliendo con las especificaciones técnicas de diámetro y cantidad de barras de acero, los equipos de trabajo ensamblaron y amarraron las barras con precisión, manteniendo las distancias y configuraciones requeridas.
- Demoliciones edificio hospitalización: Se continuo con la demolición del área de hospitalización, la demolición de partes específicas y delicadas del edificio, como muros

internos, techos, y elementos no estructurales, se realizó manualmente utilizando herramientas de demolición manual como martillos, cinces y cortadoras. Se trabajó de forma progresiva, demoliendo las vigas y columnas del piso superior hacia abajo, para mantener la estabilidad del edificio y prevenir colapsos inesperados. El equipo de trabajadores demolió secciones pequeñas en cada fase, controlando la caída de escombros para evitar daños a las áreas circundantes. Se emplearon técnicas de corte y fragmentación en lugar de derribo completo, minimizando vibraciones que pudieran afectar edificaciones cercanas.

Estas actividades se desarrollaron de acuerdo con el cronograma del proyecto bajo la supervisión y acompañamiento del equipo de trabajo interventor a fin de asegurar que cada etapa fuera inspeccionada y validada para cumplir con los estándares de calidad y seguridad establecidos.

VACIADO DE CONCRETOS PARA PILOTES



EXCAVACIONES PARA SOTANO Y VIGAS DE CIMENTACION EDIFICIO ASISTENCIAL




PROTECCION DE TAULD



INDEPENDIZACION DE PLACA Y DEMOLICIÓN EDIFICIO HOSPITALIZACIÓN



DESCABECE DE PILOTES Y DEMOLICIÓN TANQUE SUBTERRANEO

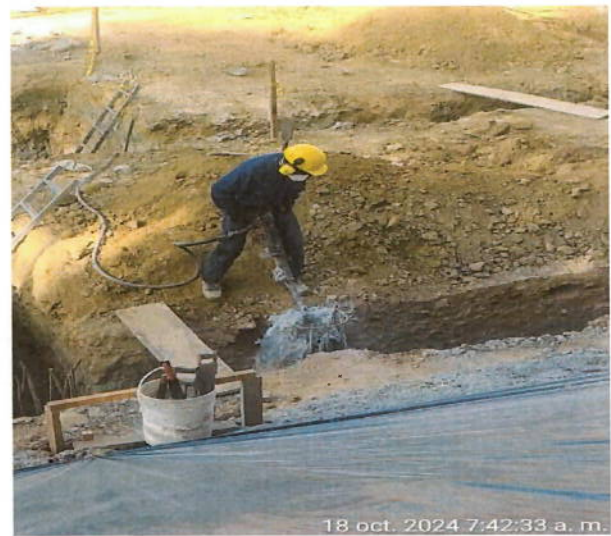

**AMARRE DE ACERO DE REFUERZO PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN E INTSLACIÓN DE
REDES DE DESAGUE SANITARIO**



4. Certificados y resultados de laboratorio

- Se realizó entrega de informe de resultados pruebas a compresión para concretos vaciados durante el periodo,
- certificados de calidad de acero de refuerzo allegado a obra para edificio asistencial vigas de cimentación y placa de sótano
- Considerando que la actividad de pilotaje se culminó, se tiene estimado realizar pruebas de continuidad a pilotes.

5. ASPECTOS RELEVANTES EN EL PRESENTE PERIODO

- Se continua a la espera y respuesta de la solicitud por parte del consorcio san vicente en el suministro de la informacion oficial para las diferentes especialidades informacion que refiere a planimetria , detalles y cortes de fachada para los edificios 1, 2 y 3 del lote B
- Se acuerdo entre las partes involucradas supervision , interventoria y constructor presentar propuesta de material (bloque) para mamposteria de edificios tecnicos del lote B , afin de establecer materialidad y acabado de las mismas
- Teniendo en cuenta el informe estructural realizado y presentado por parte del consorcio san vicente en el cual se evidencian algunas inconsistencias de indole tecnico , a la fecha no se ha dado respuesta y/o consideraciones del mismo.
- Por parte del consorcio san vicente se solicito aclaracion de la construccion del tanque de almacenamiento de incendio indicado en la planimetria estructural entre los ejes 7-8 y BD área de sotano, el cual no se encuentra establecido en la planimetria arquitectonica de sotano plano AG-03 DE 30 , de igual forma los tanques de agua potable entre ejes 6-7 y CD los cuales presentan discrepancias en tamaño en respecto a la version indicada en la planimetria arquitectonica vs el despiece y planta estructural
- Se continua a la espera por parte del consorcio san vicente caracterización de aguas a la entrada de la ptar , afin de establecer los parametros que requiere la planta que esta involucrada en la ejecucion del proyecto
- Se realizo el armado y vaciado de concreto para placa de cubierta edificio tecnico 02 en lote B
- Se completo la actividad de pilotaje (149 pilotes) , actividad de cimentacion desarrollada en su totalidad según los detalles y planos de cimentacion entregados para construccion

6. CONCLUSIONES.

En el presente periodo se culminó con la ejecución del proceso de pilotaje los cuales se desarrollaron en un 100% ✓

Se continua con el desarrollo de actividades en lote A Y B, los cuales corresponden a edificio asistencial y sub estación eléctrica respectivamente

Se ha realizado el armado y vaciado de concreto de la placa de cubierta del edificio técnico 02 en el Lote B, lo que representa un avance en la construcción de este sector del proyecto. ✓

El informe estructural presentado por el Consorcio San Vicente muestra inconsistencias técnicas que aún no han sido respondidas ni consideradas. Este punto es crítico y debe ser resuelto para garantizar la estabilidad y seguridad de las estructuras involucradas.


CERTIFICADO

Mediante la presente CERTIFICAMOS que nuestro cliente **CONSORCIO SAN VICENTE** identificado con NIT **901.785.549 -8**, es cuenta habiente del Banco de Occidente desde el día 26 de enero de 2024 con la Cuenta Corriente No. 267877108, la cual se encuentra activa y vigente.

Por lo anterior podemos afirmar que la mejor carta de presentación de la empresa, **CONSORCIO SAN VICENTE** es ser un "Cliente activo del Banco de Occidente".

Expedimos esta certificación a **CONSORCIO SAN VICENTE**, hoy 26 de enero del 2024.

Cordial Saludo,



Yesenia Paola Ortiz Rodriguez
Gerente de Relación- Banca Empresas
Vicepresidencia de Empresas

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14970531870



(415)7707212489984(8020) 000001497053187 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

9 0 1 7 8 5 5 4 9 8

Impuestos y Aduanas de Neiva

1 3

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

65. Fondos

66. Cooperativas

68. Sin personería jurídica

3

69. Otras organizaciones no clasificadas

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y lasoportunizados

67. Sociedades y organismos extranjeros

70. Beneficio

1

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento

1. Constitución

2. Reforma

71. Clase

0 4

72. Número

73. Fecha

2 0 2 3 1 2 1 5

74. Número de notaría

75. Entidad de registro

9 8

76. Fecha de registro

2 0 2 3 1 2 1 5

77. No. Matricula mercantil

78. Departamento

4 1

79. Ciudad/Municipio

0 0 1

82. Nacional 1 0 0 %

83. Nacional público 0 . 0 %

84. Nacional privado 1 0 0 . 0 %

85. Extranjero 0 %

86. Extranjero público 0 . 0 %

87. Extranjero privado 0 . 0 %

Vigencia

80. Desde

2 0 2 3 1 2 1 5

81. Hasta

2 0 4 5 1 2 3 0

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1				-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica

94. Nombre del grupo económico y/o empresarial

95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante

96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior

171. País

172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14970531870



(415)7707212489984(8020) 000001497053187 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

9 0 1 7 8 5 5 4 9

8

Impuestos y Aduanas de Neiva

1 3

Representación

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN	1 8
100. Tipo de documento	101. Número de identificación
Cédula de Ciudadanía	1 3 7 7 1 1 6 1 2
104. Primer apellido	105. Segundo apellido
POLO	POLANIA
106. Primer nombre	107. Otros nombres
WILLIAM	ALEXANDER
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV
98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL	1 9
100. Tipo de documento	101. Número de identificación
Cédula de Ciudadanía	1 3 7 9 9 0 5 7 1 8
104. Primer apellido	105. Segundo apellido
CASTILLO	FAJARDO
106. Primer nombre	107. Otros nombres
TELMO	ALEXANDER
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV
98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
100. Tipo de documento	101. Número de identificación
104. Primer apellido	105. Segundo apellido
106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV
98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
100. Tipo de documento	101. Número de identificación
104. Primer apellido	105. Segundo apellido
106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV
98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
100. Tipo de documento	101. Número de identificación
104. Primer apellido	105. Segundo apellido
106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14970531870



(415)7707212489984(8020) 000001497053187 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

9 0 1 7 8 5 5 4 9 | 8 Impuestos y Aduanas de Neiva

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

111. Tipo de documento NIT	112. Número de identificación 8 3 0 0 3 7 3 2 2	113. DV 8	114. Nacionalidad COLOMBIA	115. Otros nombres 1 6 9
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
119. Razón social PROTELCA INGENIEROS ARQUITECTOS S.A.S				
120. Valor capital del socio 289,663,782,473	121. % Participación 3 3	122. Fecha de ingreso 2 0 2 3 1 2 1 5	123. Fecha de retiro	

111. Tipo de documento NIT	112. Número de identificación 8 9 2 0 0 2 9 8 5	113. DV 5	114. Nacionalidad COLOMBIA	115. Otros nombres 1 6 9
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
119. Razón social CONSTRUSAR SA				
120. Valor capital del socio 289,663,782,473	121. % Participación 3 3	122. Fecha de ingreso 2 0 2 3 1 2 1 5	123. Fecha de retiro	

111. Tipo de documento NIT	112. Número de identificación 9 0 0 0 7 2 6 6 7	113. DV 5	114. Nacionalidad COLOMBIA	115. Otros nombres 1 6 9
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
119. Razón social SEINGECOL S.A.S. SERVICIO DE INGENIERIA COLOMBIANA				
120. Valor capital del socio 289,663,782,473	121. % Participación 3 3	122. Fecha de ingreso 2 0 2 3 1 2 1 5	123. Fecha de retiro	

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	

100



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 7.711.612
POLO POLANIA

APELLIDOS
WILLIAM ALEXANDER

NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 26-AGO-1979
NEIVA
(HUILA)

LUGAR DE NACIMIENTO
1.85 O+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO

19-SEP-1997 NEIVA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARNEL SANCHEZ TORRES



A-1900100-00177863-M-0007711612-20090914

0016037060A 1

6670033354

COMPROBANTE

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
899999034	BANCO DE OCCIDENTE	121328763	1099148395	04/12/2024

Razón Social: **SENA**

Usuario Pagador: **901785549**

Descripción del Pago: **Pago Ordinario - FIC**

Dirección IP: **181.61.210.22**

Su transacción fue **APROBADA** por la Entidad Financiera

Total Pagado **\$ 976,566.00**

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
Pago Ordinario - FIC	1	\$ 976,566.00	COP\$ 976,566.00

1. The first part of the document is a list of names and addresses of the persons who have been interviewed.

2. The second part of the document is a list of the questions asked of the interviewees.

3. The third part of the document is a list of the answers given by the interviewees.

4. The fourth part of the document is a list of the conclusions drawn from the interviews.

5. The fifth part of the document is a list of the recommendations made by the interviewees.

6. The sixth part of the document is a list of the conclusions drawn from the recommendations.

7. The seventh part of the document is a list of the conclusions drawn from the recommendations.

8. The eighth part of the document is a list of the conclusions drawn from the recommendations.

9. The ninth part of the document is a list of the conclusions drawn from the recommendations.

10. The tenth part of the document is a list of the conclusions drawn from the recommendations.

11. The eleventh part of the document is a list of the conclusions drawn from the recommendations.

12. The twelfth part of the document is a list of the conclusions drawn from the recommendations.

13. The thirteenth part of the document is a list of the conclusions drawn from the recommendations.

NIT

899999034

Medio de Pago

BANCO DE
OCCIDENTE

No. Transacción

121328763

No. Autorización/CUS Fecha y Hora

1099148395

04/12/2024

Número de Identificación

901785549

Primer Nombre ó Razón Social

CONSORCIO SAN VICENTE

Primer Apellido (si es Persona natural)**Tipo de documento**

01

Dígito de Verificación (Si es persona

8

Naturaleza Juridica

01

Departamento

HUILA

Ciudad Capital

NEIVA (HUILA)

Dirección de Domicilio

CR 4 2 85 ZN INDUSTRIAL KM 3 2 VIA PALER

Ciudad de Domicilio

neiva

Localización

Nacional

Teléfono de Contacto

+57,317 0884254

Correo electrónico

consorciosanvicente2024@gmail.com

Código SIIF

3-2-07-1-02-1-04-43

Regional

Huila

Regional Centros SIIF

36-02-00-041-000000

Número Licencia de Obra

0

Número Contrato de Obra

090-2024

Nombre Obra

HTAL DTAL SAN VICENTE HUILA

Fecha Inicio Obra

20/03/2024

Fecha Terminación Obra

19/10/2026

Ciudad de Ejecución de la Obra

GARZON

Tipo FIC

Costo Total de Obra (Sin Aportes)

Año Periodo a Pagar

2024

Mes Periodo a Pagar

11

Costo Total de Obra a Todo Costo

390626459.00

Costo Total Mano de Obra

390626459.00

Número de Trabajadores en el Periodo

10

Valor Intereses Moratorios

0.00

Aporte FIC

976566.00

Aporte SENA

0.00

Valor del Pago


976566.00

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO

Yo, **WILLIAM ALEXANDER POLO POLANIA** identificado con cedula de ciudadanía No. 7.711.612 de Neiva, en mi calidad de Representante Legal del CONSORCIO SAN VICENTE identificado con Nit 901.785.549-8, declaro bajo la gravedad de juramento que el consorcio se encuentra a PAZ Y SALVO en el periodo comprendido desde el primero (01) de marzo de 2024 a la fecha, con las obligaciones sobre el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensiones, Riesgos Laborales y aportes parafiscales en la parte patronal de Cajas de Compensación Familiar.

La presente certificación se expide a solicitud del INTERESADO en Neiva el veintisiete (27) del mes de noviembre de dos mil veinticuatro (2024), previa verificación por parte mía de los soportes de pago en seguridad social del consorcio en referencia.

Sin otro particular.



WILLIAM ALEXANDER POLO POLANIA
C.C. 7.711.612 de Neiva
Representante Legal


CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES

Yo, **LUZ ANGELA ROJAS**, identificada con cedula de ciudadanía No. 52.158.483 de Bogotá, y con Tarjeta Profesional No. 66489-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de CONSTRUSAR S.A. identificada con Nit 892.002.985-5, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis meses por los conceptos de pensiones, riesgos profesionales y cajas de compensación familiar

***Nota 1:** Las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios y sujetos pasivos del impuesto sobre la renta para la equidad – CREE, están exonerados del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional de Aprendizaje– SENA y del ICBF y Seguridad Social en Salud, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes, de conformidad con el artículo 7 del Decreto 1828 del 27 de agosto de 2013, reglamentario de la Ley 1607 de 2012.*

Dada en Bogotá, a los veintisiete (27) días del mes de noviembre de 2024

Atentamente,



LUZ ANGELA ROJAS TAUTIVA
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 66489-T
C.C. No. 52.158.483 de Bogotá

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO

ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002

Yo, **ANGELA ROJAS TAUTIVA**, identificado con cedula de ciudadanía No. 52.158.483 de Bogotá, en mi calidad de Revisor Fiscal de **PROTELCA INGENIEROS ARQUITECTOS SAS** con Nit **830.037.322-8**, declaro bajo la gravedad de juramento que la entidad es Contribuyente de Impuesto de Renta y Complementarios, es sujeto pasivo del Impuesto de Renta para la equidad CREE, y a su vez se encuentra a PAZ Y SALVO en el periodo comprendido desde el primero (01) de marzo de 2024 a la fecha, con las obligaciones sobre el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensiones, Riesgos Laborales y aportes parafiscales en la parte patronal de Cajas de Compensación Familiar según lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, lo dispuesto en el artículo 65 de la ley 1819 de 2016 reforma estructural y el artículo 118 de la ley de financiamiento 1943 del 28 de Diciembre de 2018 en concordancia con el artículo 114-1 del E.T. que dice:

Estarán exoneradas del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes en seguridad social de la empresa en referencia.

La presente certificación se expide a solicitud del INTERESADO en Cajicá el veintisiete (27) del mes de noviembre de dos mil veinticuatro (2024), previa verificación por parte mía de los soportes de pago.

Sin otro particular,



LUZ ANGELA ROJAS TAUTIVA
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. TP 66489-T
C.C. 52.158.483 de Bogotá

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO


ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002

Yo, **INGRID MARYOLY MEDINA GARCIA**, identificado con cedula de ciudadanía No. 1.069.741.313 de Fusagasugá (Cund.), en mi calidad de Contador de **PROTELCA INGENIEROS ARQUITECTOS SAS** con Nit **830.037.322-8**, declaro bajo la gravedad de juramento que la entidad es Contribuyente de Impuesto de Renta y Complementarios, es sujeto pasivo del Impuesto de Renta para la equidad CREE, y a su vez se encuentra a PAZ Y SALVO en el periodo comprendido desde el primero (01) de marzo de 2024 a la fecha, con las obligaciones sobre el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensiones, Riesgos Laborales y aportes parafiscales en la parte patronal de Cajas de Compensación Familiar según lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, lo dispuesto en el artículo 65 de la ley 1819 de 2016 reforma estructural y el artículo 118 de la ley de financiamiento 1943 del 28 de Diciembre de 2018 en concordancia con el artículo 114-1 del E.T. que dice:

Estarán exoneradas del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes

La presente certificación se expide a solicitud del **INTERESADO** en Cajicá el veintisiete (27) del mes de noviembre de dos mil veinticuatro (2024), previa verificación por parte mía de los soportes de pago en seguridad social de la empresa en referencia.

Sin otro particular,



INGRID MARYOLY MEDINA GARCIA

Contador

Tarjeta Profesional No. TP 211838-T

C.C. 1.069.741.313 de Fusagasugá (Cund.),



EL SUSCRITO REVISOR FISCAL

CERTIFICA

Que SEINGECOL SAS SERVICIO DE INGENIERIA COLOMBIANA Nit. 900.072.667-5, ha dado cumplimiento oportuno y completo con los aportes y demás obligaciones legales que le corresponden respecto del Sistema de Seguridad Social cuando a ello ha habido lugar, en cuanto a Salud, Pensiones, Riesgos Profesionales, aportes a Caja de Compensación Familiar.

Dado en Neiva, a los veintitrés (27) días del mes de Noviembre 2024.


HERNANDO QUINTERO MORA
Revisor Fiscal
TP-96943-T

[illegible]

E E E SAN VICENTE		MEMORIA DE CORTE DE OBRA				Codigo: PAJFO-38 Version No. 00 Fecha: 5 4 2023	
CONTRATO N°: 090		OBJETO: CONSORCIO SAN VICENTE		CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZON-HUILA		Página: 2 de 4	
CONTRATISTA: CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES		CORTE N°: 4		FECHA: OCTUBRE DE 2024			
INTERVENTORIA:							
(a) ITEM N°: 1.4.3.2		(b) DESCRIPCION ITEM		Placa aérea Aligerada Concreto 4000 PSI		(c) UND: M2	

4.80

24.85

3.05

7.55


ESPESOR 2

Elaboró: [Signature]

Revisó: [Signature]

RESIDENTE DE OBRA
Arq Francisco Barrios

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq. Jair Lozano

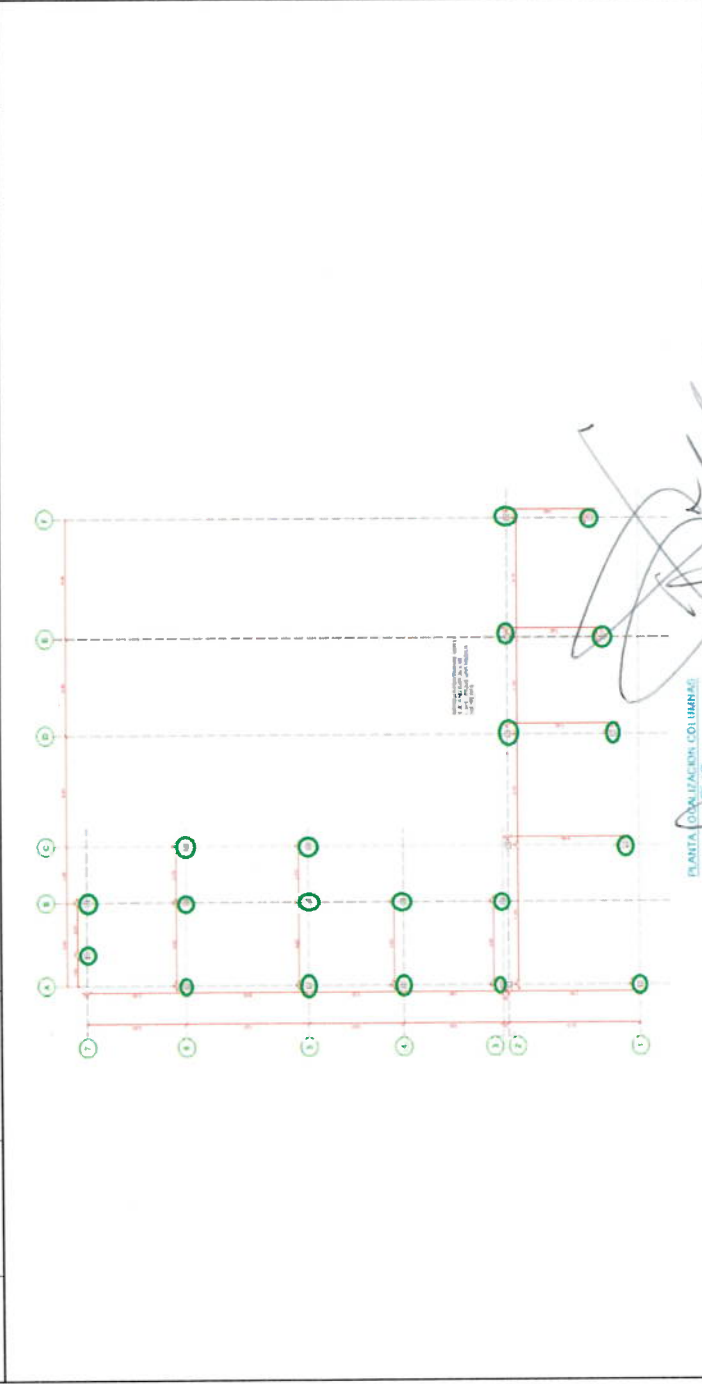		MEMORIA DE CORTE DE OBRA		Código: PATO-38		Página 2 de 4		2023	
				Versión No. 00		5		4	
				Fecha:					
CONTRATO N°:		090		OBJETO:		CONSORCIO SAN VICENTE		CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZON-HUILA	
CONTRATISTA:				CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES		CORTE N°:		4	
INTERVENTORIA:						FECHA:		OCTUBRE DE 2024	
(a) ITEM N°:		1.5.1.1		(b) DESCRIPCION ITEM		Columnas en concreto		(c) UND:	
								m3	
									
Elaboro:								RESIDENTE DE OBRA Arq. Francisco Barrera	
								RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq. Jairo Lozano	

[illegible]

 SAN VICENTE en desarrollo		MEMORIA DE CORTE DE OBRA				Codigo: PAECHO Version No. 00 Fecha: 5 4 2023	
CONTRATO N°: 090		OBJETO: CONSTRUCCION DE LA NUEVA S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZON-HUILA				FECHA: OCTUBRE DE 2024	
CONTRATISTA: CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES		CORTE N°: 4				FECHA:	
INTERVENTORIA:							
(a) ITEM N°: 3.2.1		(b) DESCRIPCION ITEM Proceso pilotes D=0.50 m con suministro de agua carro tanque				(c) UND: m3	

A

B

C

D

E

F

8

116

115

114

113

112

11

106

107

108

109

104

103

102

101

100

99

98

97

96

95

94

93

92

91

90

89

88

87

86

85

84

83

82

81

80

79

78

77


76

Elaboro:

Reviso:

RESIDENTE DE OBRA
Arq. Francisco Barros

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq. Juan Lozano

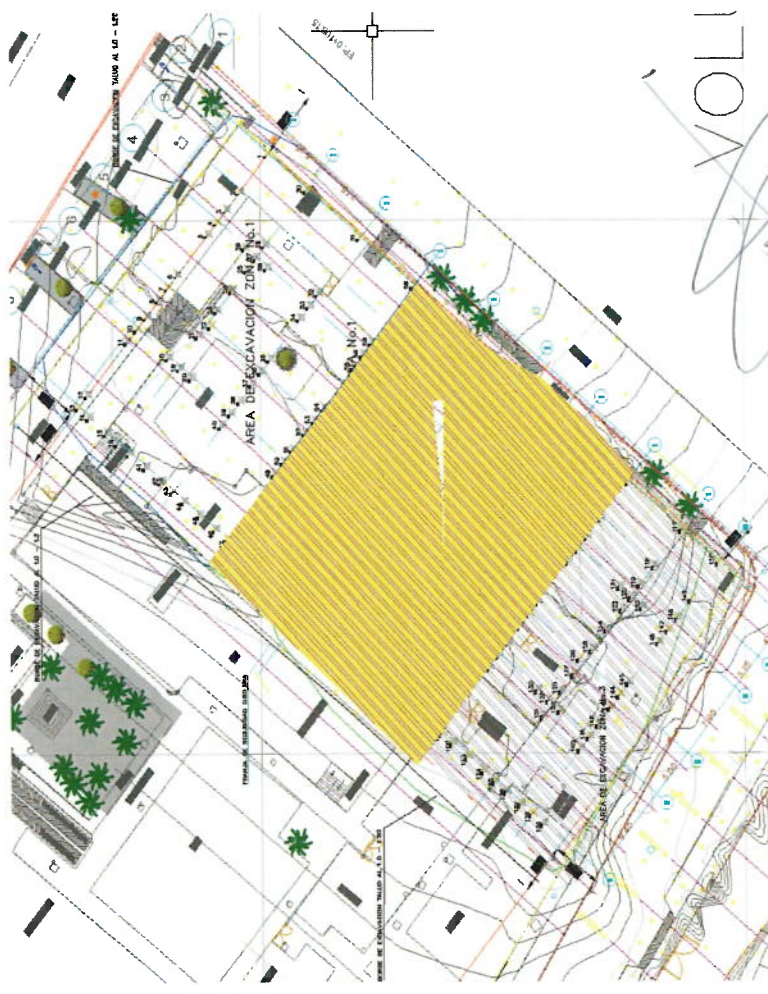 SAN VICENTE MUNICIPIO		MEMORIA DE CORTE DE OBRA				Código: PA-FO-30			
						Version No. 00	5	4	2023
						Fecha:			
CONTRATO N°:		OBJETO:	CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZON-HUILA						
CONTRATISTA:		CONSORCIO SAN VICENTE		CORTE N°:	4	FECHA :	OCTUBRE DE 2024		
INTERVENTORIA:		CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES							
(a) ITEM N°:	(b) DESCRIPCION ITEM	(c) UND:						m3	
4.2.1	EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN (Incluye cargue mecanico y retiro del material excavado a botadero.) viaje a 5km.								
									
Elaboró:									
Revisó:									
RESIDENTE DE OBRA Arq. Francisco Barrios		RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq. Jair Lozano							

[illegible]

ACTA PARCIAL DE OBRA # 04


CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA

CONTRATO DE OBRA		VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$	86,899,134,742.00	ACTA DE INICIO:	20-mar-24
CONTRATANTE: VICENTE DE PAUL DE GARZÓN	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE	VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO:	\$	-	PLAZO:	30 MESES
		VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO:	\$	-	FECHA DE TERMINACIÓN:	19-sep-26
CONTRATO DE OBRA N°:	080 DE 2024	VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$	86,899,134,742.00	FECHA DEL ACTA :	OCTUBRE 2024
CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO SAN VICENTE	VALOR TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA (Q):	\$	399,626,459.00	PORCENTAJE EJECUTADO PRESENTE ACTA:	0.45%
CONTRATO DE INTERVENTORIA	081 DE 2024	VALOR ACUMULADO TOTAL EJECUTADO:	\$	2,201,939,619.00	PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO:	2.53%
INTERVENTORIA DE OBRA :	CONSORCIO INTERCONSTRUCTO	VALOR TOTAL POR EJECUTAR:	\$	84,697,195,123.00	PORCENTAJE TOTAL POR EJECUTAR:	97.47%
SUPERVISOR(A)	MARIA ISABEL MEDINA					
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:						
ACTA DE RECIBO PARCIAL N°: 04						
PERIODO OCTUBRE 2024						

ITEM	DESCRIPCION	UND.	CONDICIONES CONTRACTUALES			PRESENTE PERIODO CORTE # 04		ACUMULADO		
			CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	% ACUM
1.4.3.2	Placa aérea Aligerada Concreto 4000 PSI	M2	231.00	\$ 461,574.00	\$ 106,623,594.00	142.31	\$ 65,685,442.00	142.31	\$ 65,685,442.00	61.60%
1.5.1.1	Columnas en concreto	M3	6.00	\$ 3,259,498.00	\$ 19,556,988.00	5.94	\$ 19,361,418.00	5.94	\$ 19,361,418.00	99.00%
3.2.1	Proceso pilotes D=0.50 m con suministro de agua carro tanque	M3	283.00	\$ 4,973,383.00	\$ 1,307,984,489.00	27.59	\$ 137,209,913.00	263.15	\$ 1,298,805,485.00	99.30%
4.2.1	EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN (incluye cargue mecanico y retiro del material excavado a botadero), viale a 5km.	M3	8,736.00	\$ 22,095.00	\$ 193,021,920.00	2,762.77	\$ 61,043,348.00	5,319.72	\$ 117,539,101.00	60.89%
4.2.3	Proteccion de talud en mortero (mortero pobre y polietileno)	M3	937.00	\$ 32,258.00	\$ 30,225,746.00	313.95	\$ 10,127,378.00	313.95	\$ 10,127,378.00	33.51%
5.1.1	Base de limpieza e=5 cm. Concreto 2000 PSI	M2	2,895.00	\$ 29,435.00	\$ 85,243,760.00	239.66	\$ 7,054,392.00	239.66	\$ 7,054,392.00	8.28%
	TOTAL COSTO DIRECTO OBRA CIVIL				\$ 58,486,944,798.00		\$ 300,481,891.00		\$ 1,693,799,707.00	2.90%
	ADMINISTRACION IMPREVISTOS			22.00%	\$ 12,867,587,858.00	22.00%	\$ 66,106,016.00	22.00%	\$ 372,635,936	
	UTILIDAD			3.00%	\$ 1,754,668,344.00	3.00%	\$ 9,014,457.00	3.00%	\$ 50,813,991	
				5.00%	\$ 2,924,447,240.00	5.00%	\$ 15,024,095.00	5.00%	\$ 84,689,985	
	VALOR TOTAL AUI			30.00%	\$ 17,546,683,440.00	30.00%	\$ 90,144,568.00	30.00%	\$ 508,139,912.00	
	TOTAL OBRA				\$ 76,035,628,238.00		\$ 390,626,209.00		\$ 2,201,739,619.00	
	TOTAL OBRA CIVIL				\$ 86,733,661,658.00		\$ 390,626,459.00		\$ 2,201,939,619.00	0.00%
	TOTAL CERTIFICACIONES				\$ 165,473,085.00		\$ 0.00		\$ 0.00	
	ANTICIPO ENTREGADO									
	AMORTIZACION DE ANTICIPO	30.00%			\$ 26,069,740,423		\$ 117,087,937.74		\$ 660,561,685.70	
	DESCUENTOS									
	TOTAL PROYECTO				\$ 86,899,134,743.00		\$ 273,438,521.30		\$ 1,541,357,233.30	

Ing. Argelio Cerquera Araujo
Representante Legal de Interventoría
CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES

Ing. William Rob Planas
Representante Legal Constructor
CONSORCIO SAN VICENTE

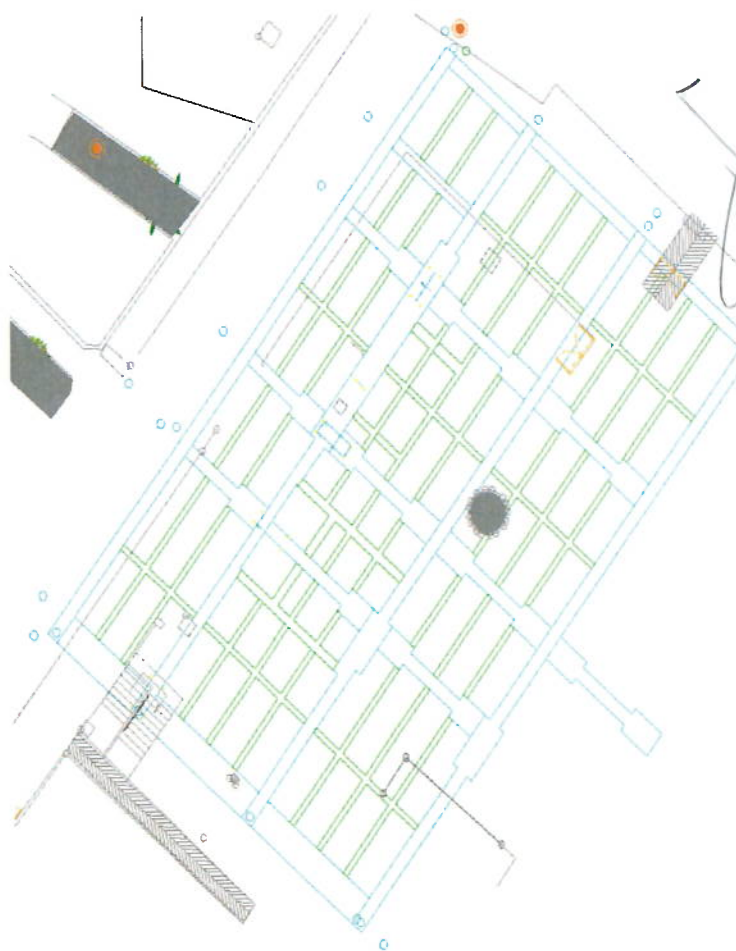SAN VICENTE		MEMORIA DE CORTE DE OBRA		Código: PA-FO-30 Versión No. 00 Fecha: 5 4 2023	
CONTRATO N°:		OBJETO:		CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZON-HUILA	
CONTRATISTA:		CONSORCIO SAN VICENTE		CORTE N°:	
INTERVENTORIA:		CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES		FECHA :	
				OCTUBRE DE 2024	
(a) ITEM N°:	5.1.1	(b) DESCRIPCION ITEM	Base de limpieza e=5 cm, Concreto 2000 PSI		
				(c) UND:	M2
					
Elaboró:					
RESIDENTE DE OBRA Arq. Francisco Barrios		Revisó		RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq. Jair Lozano	



2024SAL00001548

**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE
PAÚL GARZÓN - HUILA**
NIT: 891.180.026-5

Al contestar, por favor cite estos datos

Radicado:
2024CS001151-1
Fecha: 2024-12-20

RESOLUCIÓN No. 0995 DE 2024
(17 de Diciembre de 2024)

"POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA EL PAGO PARCIAL No. 4 DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 090 DE 2024, SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DE GARZÓN Y CONSORCIO SAN VICENTE"

EL GERENTE DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN, en uso de sus atribuciones legales y en especial las que le confiere la ley 10 del 10 de Enero de 1990, y sus decretos reglamentarios, y

CONSIDERANDO

1. Que el artículo 13 de la Ley 1150 del 2007 determina que, las entidades estatales que por disposición legal cuenten con un régimen contractual excepcional al del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, aplicarán en desarrollo de su actividad contractual, acorde con su régimen legal especial, los principios de la función administrativa y de la gestión fiscal de que tratan los artículos 209 y 267 de la Constitución Política.
2. Que la E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DE GARZÓN, es una entidad pública descentralizada del orden Departamental, dotada de personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, de acuerdo a lo preceptuado en el artículo 194 y siguientes de la Ley 100 de 1993; la cual presta servicios de salud a la población que lo requiera; la cual además se rige en materia de contratación por el derecho privado, pero podrá discrecionalmente, utilizar las cláusulas excepcionales previstas en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública.
3. Que el artículo 4 del Acuerdo No. 016 de 2024 – Estatuto de Contratación de la E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DE GARZÓN, establece que la actividad contractual de la entidad buscará el cumplimiento de los objetivos institucionales y la continua y eficiente prestación de los servicios de salud a su cargo.
4. Que la E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DE GARZÓN procedió a realizar la Convocatoria Pública No.003 del 2023, en virtud de la cual una vez culminado el proceso de selección, suscribió el contrato de obra pública No. 090 el 04 de enero de 2024, con el CONSORCIO SAN VICENTE identificado con Nit 901.785.549-8, cuyo objeto es la "*Construcción de la Nueva E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl del Municipio de Garzón- Huila*", por valor total de **OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE Iva Incluido (\$86.899.134.742)**, y con un plazo de ejecución de treinta (30) meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio.
5. Que la cláusula quinta del contrato de obra pública No. 090 del 2024, determina como forma de pago que el contratante cancelará al contratista el valor del contrato por el sistema de precios unitarios, mediante actas de recibo parcial de obra, aprobados por el interventor y el supervisor, de acuerdo al avance de obra y el



**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE
PAÚL GARZÓN - HUILA**
NIT: 891.180.026-5

2024SAL00001548

- suministro de equipos hasta el noventa y cinco por ciento 95% previa amortización del anticipo en igual proporción al porcentaje pagado.
6. Que adicionalmente, el parágrafo primero de la cláusula quinta del contrato de obra pública, reseña que para efectos de los pagos, el contratista debe acreditar el cumplimiento de sus obligaciones con el sistema de seguridad social; y el parágrafo segundo de la misma, establece que para los mismos efectos, aquel deberá aportar un informe firmado por el interventor que contenga el valor del contrato ejecutado y pendiente por ejecutar, sustentando con memorias de cantidades de obras detalladas con los respectivos esquemas y planos de ubicación, aprobados por la interventoría y la supervisión; porcentaje de ejecución física a la fecha; informe de ejecución, avance y estado de la obra con registro fotográfico; el plazo del contrato y el faltante por ejecutar; adicionales en valor y plazo; suspensiones del contrato; vigencias de las garantías de contrato; constancia de encontrarse a paz y salvo con los pagos al sistema de seguridad social y parafiscales; cumplimiento de las obligaciones del contrato; la descripción, cantidad y costos de los imprevistos que se causaron durante el periodo de obra; equipos y personal utilizado durante el periodo de la obra; el valor a pagar con el acta de recibo parcial del contrato de obra (con su respectivo informe de avance).
 7. Que el parágrafo cuarto de la cláusula quinta del contrato de obra pública, consagra que los valores a pagar se efectuaran tomando como base el avance de las obras, certificado por el interventor y el supervisor, cuyo valor corresponderá al resultado multiplicar las cantidades de obra realmente ejecutadas a la fecha de corte, por los precios unitarios pactados.
 8. Que el contratista CONSORCIO SAN VICENTE, identificado con NIT 901.785.549-8, presentó cuenta de cobro a la E.S.E. Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón por el anticipo correspondiente al 30% del valor del Contrato de Obra No. 090 de 2024, trámite que fue avalado por la interventoría mediante el Oficio ICHDSV-27-2024 y certificado por el Supervisor del Contrato el 9 de abril de 2024, quien verificó que se cumplió con la documentación requerida, incluyendo el visto bueno del Profesional Universitario Almacén; en consecuencia, el pago del anticipo fue girado el 18 de abril de 2024.
 9. Que el CONSORCIO SAN VICENTE con Nit 901.785.549-8 presentó la factura No. CSV 2 y el ACTA PARCIAL DE OBRA No. 001 a la E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DE GARZÓN por valor de DOSCIENTOS OCHO MILLONES NOVECIENTOS CINCO MIL SETECIENTOS DOCE PESOS CON SESENTA CENTAVOS M/CTE (\$208.905.712,60) correspondiente a un pago parcial del Contrato de Obra No. 090 de 2024. De dicho valor, se descontó el 30% para la amortización del anticipo, según lo establecido en la cláusula quinta del contrato, resultando un total neto a pagar de CIENTO CUARENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS (\$146.233.999). Este pago fue avalado y aprobado por la interventoría, contando con el visto bueno del supervisor y el apoyo técnico a la supervisión, y autorizado mediante la Resolución 0868 del 17 de octubre de 2024.



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE
PAÚL GARZÓN - HUILA
NIT: 891.180.026-5

2024SAL00001548

10. Que luego, el CONSORCIO SAN VICENTE con Nit 901.785.549-8 presentó factura No. CSV 3 de fecha 08 de noviembre del 2024, y el ACTA PARCIAL DE OBRA N°002 a la E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DE GARZÓN por valor de SETECIENTOS DIECINUEVE MILLONES SEISCIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON CUARENTA CENTAVOS M/CTE (\$719.606.482,40) correspondiente a un pago parcial del Contrato de Obra No. 090 de 2024. De dicho valor, se descontó el 30% para la amortización del anticipo, según lo establecido en la cláusula quinta del contrato, resultando un total neto a pagar de QUINIENTOS TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTIUN MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON CUARENTA CENTAVOS M/CTE(\$503.721.537,40) Este pago fue avalado y aprobado por la interventoría, contando con el visto bueno del supervisor y el apoyo técnico a la supervisión, y autorizado mediante la Resolución 0916 del 08 de Noviembre de 2024.
11. Que posteriormente, el CONSORCIO SAN VICENTE con Nit 901.785.549-8 presentó factura No. CSV 6 y el ACTA PARCIAL DE OBRA N°003 a la E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DE GARZÓN por valor de OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS CON SETENTA CENTAVOS M/CTE (\$882.800.683,70), correspondiente a un pago parcial del Contrato de Obra No. 090 de 2024. De dicho valor, se descontó el 30% para la amortización del anticipo, según lo establecido en la cláusula quinta del contrato, resultando un total neto a pagar SEISCIENTOS DIECISIETE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE(\$617.960.479) Este pago fue avalado y aprobado por la interventoría, contando con el visto bueno del supervisor y el apoyo técnico a la supervisión, y autorizado mediante la Resolución 0971 del 05 de Diciembre de 2024
12. Que el CONSORCIO SAN VICENTE identificado con Nit 901.785.549-8, junto con el interventor de la obra CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES, el apoyo técnico a la supervisión HARCOL INGENIERIA S.A.S y la supervisora, suscribieron el ACTA PARCIAL DE OBRA NO. 004 de fecha 31 de Octubre del 2024, la cual comprende el periodo del 01 al 31 de Octubre del 2024, conforme a lo establecido en la cláusula quinta del contrato de obra pública No. 090 del 2024.
13. Que en consecuencia, el CONSORCIO SAN VICENTE mediante factura electrónica de venta No. CSV5 de fecha 5 de diciembre del 2024, facturó por concepto del contrato de obra pública No. 090 del 2024, la suma de TRESCIENTOS NOVENTA MILLONES SEISCIENTOS VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON TREINTA CENTAVOS M/CTE (\$390.626.458,30).
14. Que una vez cumplidos los requisitos antes expuestos por parte del contratista y conforme al ACTA PARCIAL DE OBRA NO. 004 del 31 de Octubre del 2024, la Entidad autoriza el pago por concepto de pago parcial del contrato de obra pública No. 090 del 2024, por la suma de TRESCIENTOS NOVENTA MILLONES SEISCIENTOS VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON TREINTA CENTAVOS M/CTE (\$390.626.458,30), de los cuales se descontara el 30% para amortización del anticipo de acuerdo a la cláusula quinta del mismo, para un total de **DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES**



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE
PAÚL GARZÓN - HUILA
NIT: 891.180.026-5

2024SAL00001548

**CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VEINTIUN PESOS
M/CTE (\$273.438.521).**

15. Que en mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Reconocer a favor del **CONSORCIO SAN VICENTE** con NIT 901.785.549-8, la suma de **DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VEINTIUN PESOS M/CTE (\$273.438.521)**, en calidad de pago parcial No.4 del contrato de obra pública No. 090 de 2024, menos retenciones de ley.

PARÁGRAFO:

Hace parte integral del presente acto administrativo: El Acta parcial de obra No. 04 de fecha 31 de octubre del 2024, y la factura electrónica de venta No. CSV5 del 05 de diciembre del 2024.

ARTÍCULO SEGUNDO: Autorizar a la Pagadora de la E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DE GARZÓN, para que con cargo a los recursos del Sistema General de Regalías, a través del medio o herramienta de pago dispuesto por el SGR, pague y transfiera el reconocimiento hecho en el artículo anterior, a la cuenta corriente No. 267877108 del banco de Occidente de propiedad del CONSORCIO SAN VICENTE NIT 901.785.549-8.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Garzón (Huila) a los diecisiete (17) días del mes de Diciembre de dos mil veinticuatro (2024).

CARLOS DANIEL MAZÁBEL CÓRDOBA
Gerente

Proyectó: Luis Fernando Castro Maje



Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHIalarcon

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-410003

Fecha y Hora Sistema: 2025-01-14-4:21 p. m.

LAURA PIEDAD ALARCON CULMA

ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL

RELACION DE PAGOS					
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	901785549	Tercero:	
DOCUMENTO SOPORTE					
Tipo:	CONTRATO	Número:	090 DE 2024	Fecha:	2024-01-04
OBJETO					
Objeto:	CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.SE. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZON HUILA				
Unidad / Sub-Unidad:	03-410003 ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL			Número de Compromiso:	224

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	TIPO	NUMERO	CODIGO
2024-11-15	1024	146.233.999,00		1124		186834924	2024-11-21	146.233.999,00	18.801.515,00	127.432.484,00	267877108	BANCO DE OCCIDENTE			01-130100-DT
2024-12-03	1224	503.724.538,00		1324		189121724	2024-12-23	503.724.538,00	64.764.583,00	438.959.955,00	267877108	BANCO DE OCCIDENTE			01-130100-DT
2024-12-20	1524	617.960.480,00		1624		189517824	2024-12-27	617.960.480,00	79.452.061,00	538.508.419,00	267877108	BANCO DE OCCIDENTE			01-130100-DT
2024-12-23	1624	273.438.521,00		1724		189520324	2024-12-27	273.438.521,00	35.156.381,00	238.282.140,00	267877108	BANCO DE OCCIDENTE			01-130100-DT

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente menciondas

